

その他報告事項について

○鶴川第三小学校の教室整備工事の進捗状況

1.進捗状況

5月に行った入札手続きが不調に終わったため、工事内容(※)および工事期間を変更し、再度入札手続きを実施しました。その結果、7月8日に契約を締結しました。現場への着手は8月4日から開始し、夏休み期間中に大きな音の出る解体工事を実施しました。

9月からは、児童が学校生活を送りながらの工事となるため、学校と協力し、教育活動に支障が出ないように配慮し、土日を中心に工事を進めていきます。


2. 工事写真

工事前後の写真(一部)となります。

・1 階和室 施工前



・1 階和室 施行後

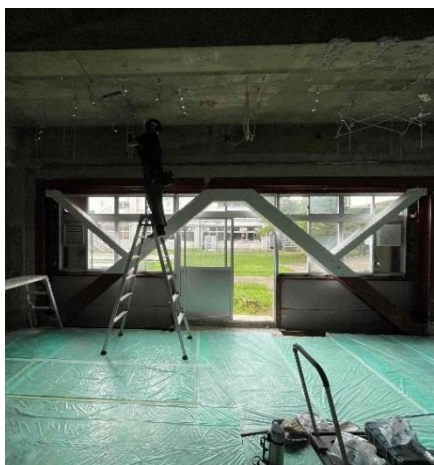

※当初予定していた外壁補修工事については、除いた内容で契約しました。

外壁については、状況を踏まえながら対応していきます。
