


工事の進め方


工事の進め方	仮設建設 → 引越し → プール、体育館、校舎解体 → 新校舎建設（校舎、体育館、プール） → 引越し → 仮設解体・グラウンド整地
--------	--------------------------------------------------------------------

一般的な工事期間（4年9ヵ月）


仮設建設	6ヵ月
引越し	1ヵ月
解体（プール）	3ヵ月
解体（体育館）	3ヵ月
解体（校舎）	6ヵ月
新校舎建設（校舎）	27ヵ月
新校舎建設（体育館）	
新校舎建設（プール）	
引越し	1ヵ月
仮設解体	4ヵ月
グラウンド整地	6ヵ月

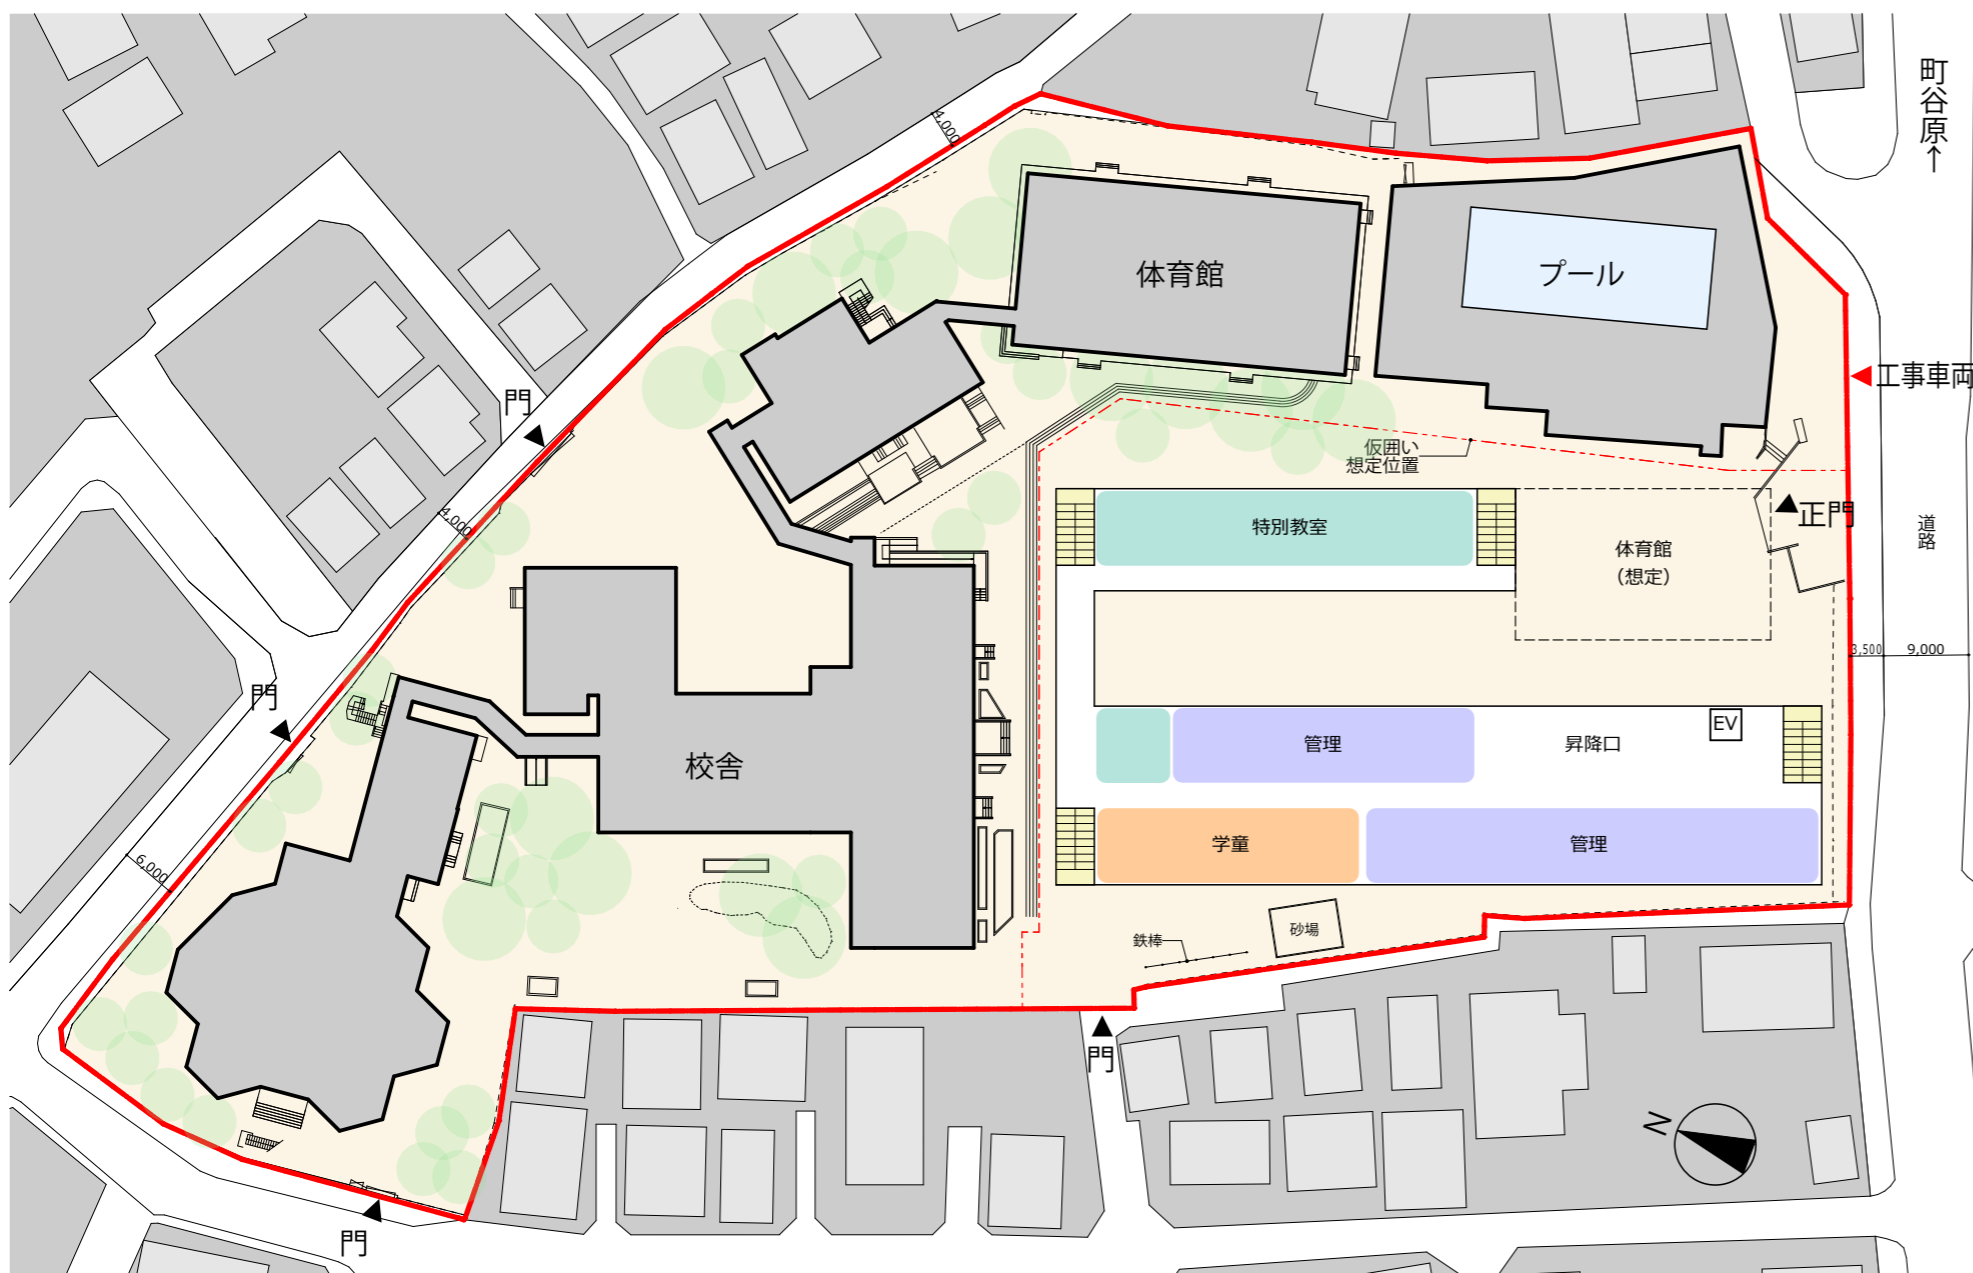

既存校舎・仮設校舎 配置・1階イメージ

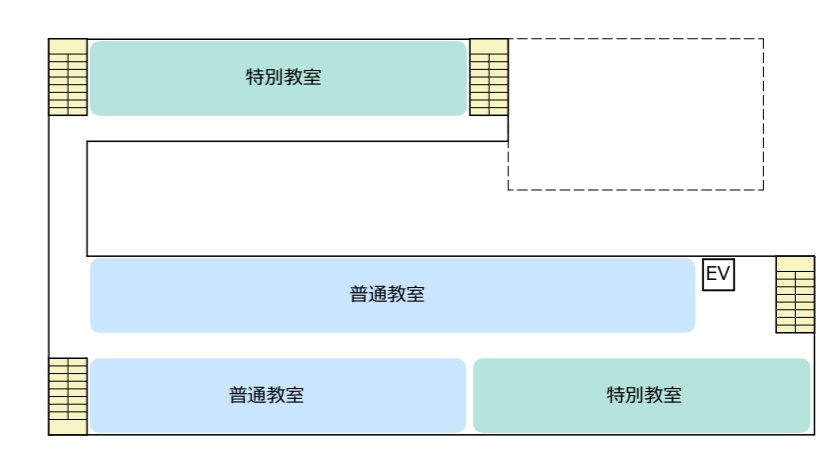

仮設校舎 3階イメージ

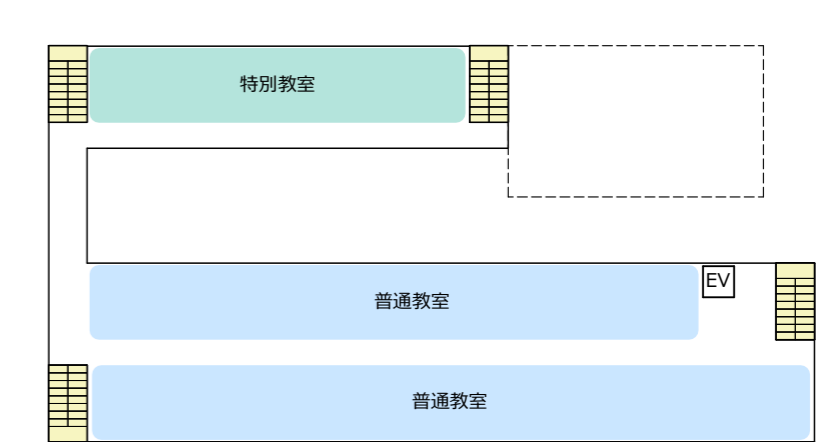

仮設校舎 2階イメージ

仮設校舎 3階床面積：2,105㎡  
 仮設校舎 2階床面積：2,105㎡  
 仮設校舎 1階床面積：2,105㎡  
 仮設校舎延床面積：6,315㎡

敷地面積：13,650㎡
