

新校舎整備の進捗について

成瀬小学校の新校舎の整備に向けて、新校舎建設工事を進めています。
本日は現在の進捗と、今後の予定についてご報告いたします。

1 新校舎の設計

新校舎床面積	約11,500㎡（旧南第二小の約1.5倍）
構造・規模	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・地上4階
普通教室	20室
特別支援教室	5室
特別教室	5室

○新校舎イメージ

<外観>




<外観>



<昇降口>



＜普通教室・オープンスペース＞

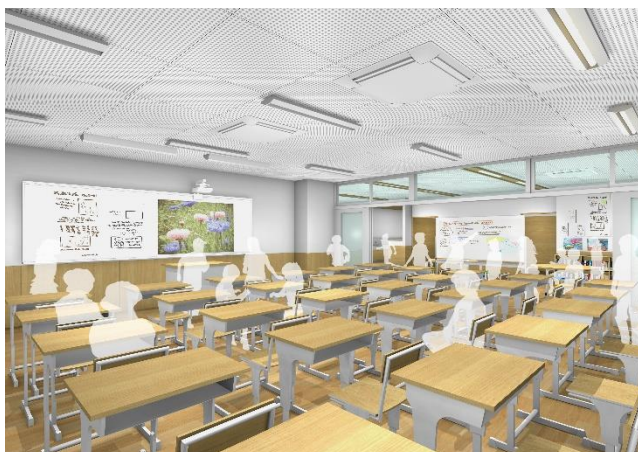


＜ラーニングセンター＞



＜体育館＞



＜プール＞

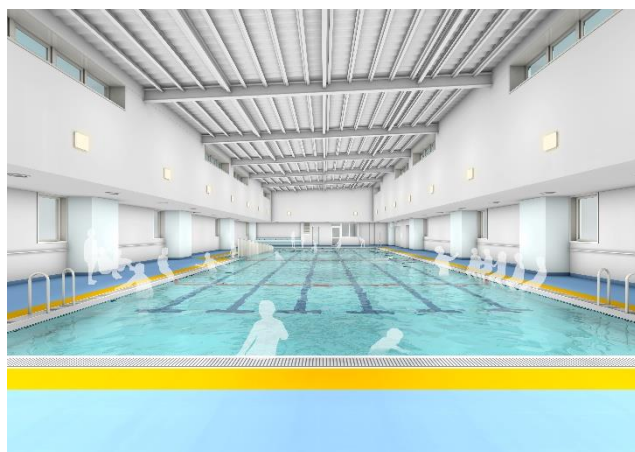

2 新校舎建設工事の進捗

2026 年 2 月に既存校舎の解体工事が完了しました。同月より新校舎建設工事に着手しています。現在は基礎躯体工事を進めており、進捗は当初計画どおりとなっています。

＜建設工事の様子（2026年4月9日時点）＞



3 今後の予定

新校舎の建設工事については、2026年2月から25か月間の予定で作業を行い、2028年4月から新校舎での生活を開始する予定です。

2026年												2027年			...	2028年			...
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		2月	3月	4月	
新築工事（25か月）															引 渡 し	新校舎使用開始			
解体工事																			

新校舎の工事の進捗状況については、こちらのページからご確認ください。

