

2025年度 バリアフリー部会 活動報告

- (1) 開催日時 2025年10月7日(火) 14時～16時
 (2) 場 所 町田市役所 2階 会議室2-1
 (3) 審議事項 町田市バリアフリー基本構想の進行管理について
 (4) 部会員名簿

区分	所 属	氏 名
1 学識経験者	日本大学理工学部まちづくり工学科 准教授	山 崎 晋
2 学識経験者	東洋大学人間科学総合研究所 客員研究員	川 内 美 彦
3 市民 (障がい者 肢体不自由)	町田市身体障害者福祉協会	都 筑 京 美
4 市民 (障がい者 視覚)	町田市身体障害者福祉協会	風 間 幸 子
5 市民 (障がい者 聴覚)	町田市聴覚障害者協会	木 村 純 子
6 市民 (障がい者 知的)	町田市障がい児・者「親の会」連絡会	本 間 美 穂
7 市民 (障がい者 精神)	NPO法人町田市精神障害者さるびあ会 会長理事	飯 長 喜 一 郎
8 市民 (障がい者 高齢者)	町田市老人クラブ連合会	小 倉 豊 司
9 市民 (民生委員・児童委員)	町田市民生委員児童委員協議会 (町田市南第二地区民生委員児童委員協議会 会長)	遠 山 育 子
10 市民 (町内会・自治会)	町田市町内会・自治会連合会	仲 村 清 彦
11 福祉団体	社会福祉法人町田市社会福祉協議会地域福祉課 主幹兼係長	佐 々 木 麻 衣 子
12 福祉団体	NPO法人町田ハンディキャプ友の会 事務局長	井 上 廣 美
13 関係行政機関 (国)	国土交通省関東運輸局交通政策部共生社会推進課 課長	平 井 靖 範
14 関係行政機関 (東京都)	東京都都市整備局都市基盤部交通企画課 交通政策担当課長	荒 井 大 介
15 関係行政機関 (東京都)	東京都福祉局生活福祉部企画課福祉のまちづくり担当 課長代理	川 田 勝 也

- (5) 部会が出された主な意見

○歩道と車道の段差について

車いすやベビーカー利用者にとっては段差がない方が望ましいが、視覚障がい者にとっては、白杖で境界を認識するために2cm程度の段差が安全確保に不可欠であるという、当事者間でのニーズの違いがある。双方の安全を両立させる工夫ができないか。

○バリアフリーの啓発について

道路や駅のホームの若干の傾斜は、車いす利用者などにとってバリアに感じられるものだが、排水のために必要なものでもある。このようなことを市民や子どもたちに啓発していく必要がある。

○事業実施の働きかけについて


基本構想は民間建築物への影響力が弱いいため、事業が進みづらい現状がある。教育啓発などを通じて、積極的に民間事業者にバリアフリーへの理解と協力を働きかける必要がある。

○進捗管理方法について

事業の進捗確認等を行う際は、「できていない点」を把握するだけでなく、「なぜそうなったのか」という原因を根本から探る視点が重要である。



町田市バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー面的整備の進捗状況について 町田駅周辺地区 (2011年11月策定)

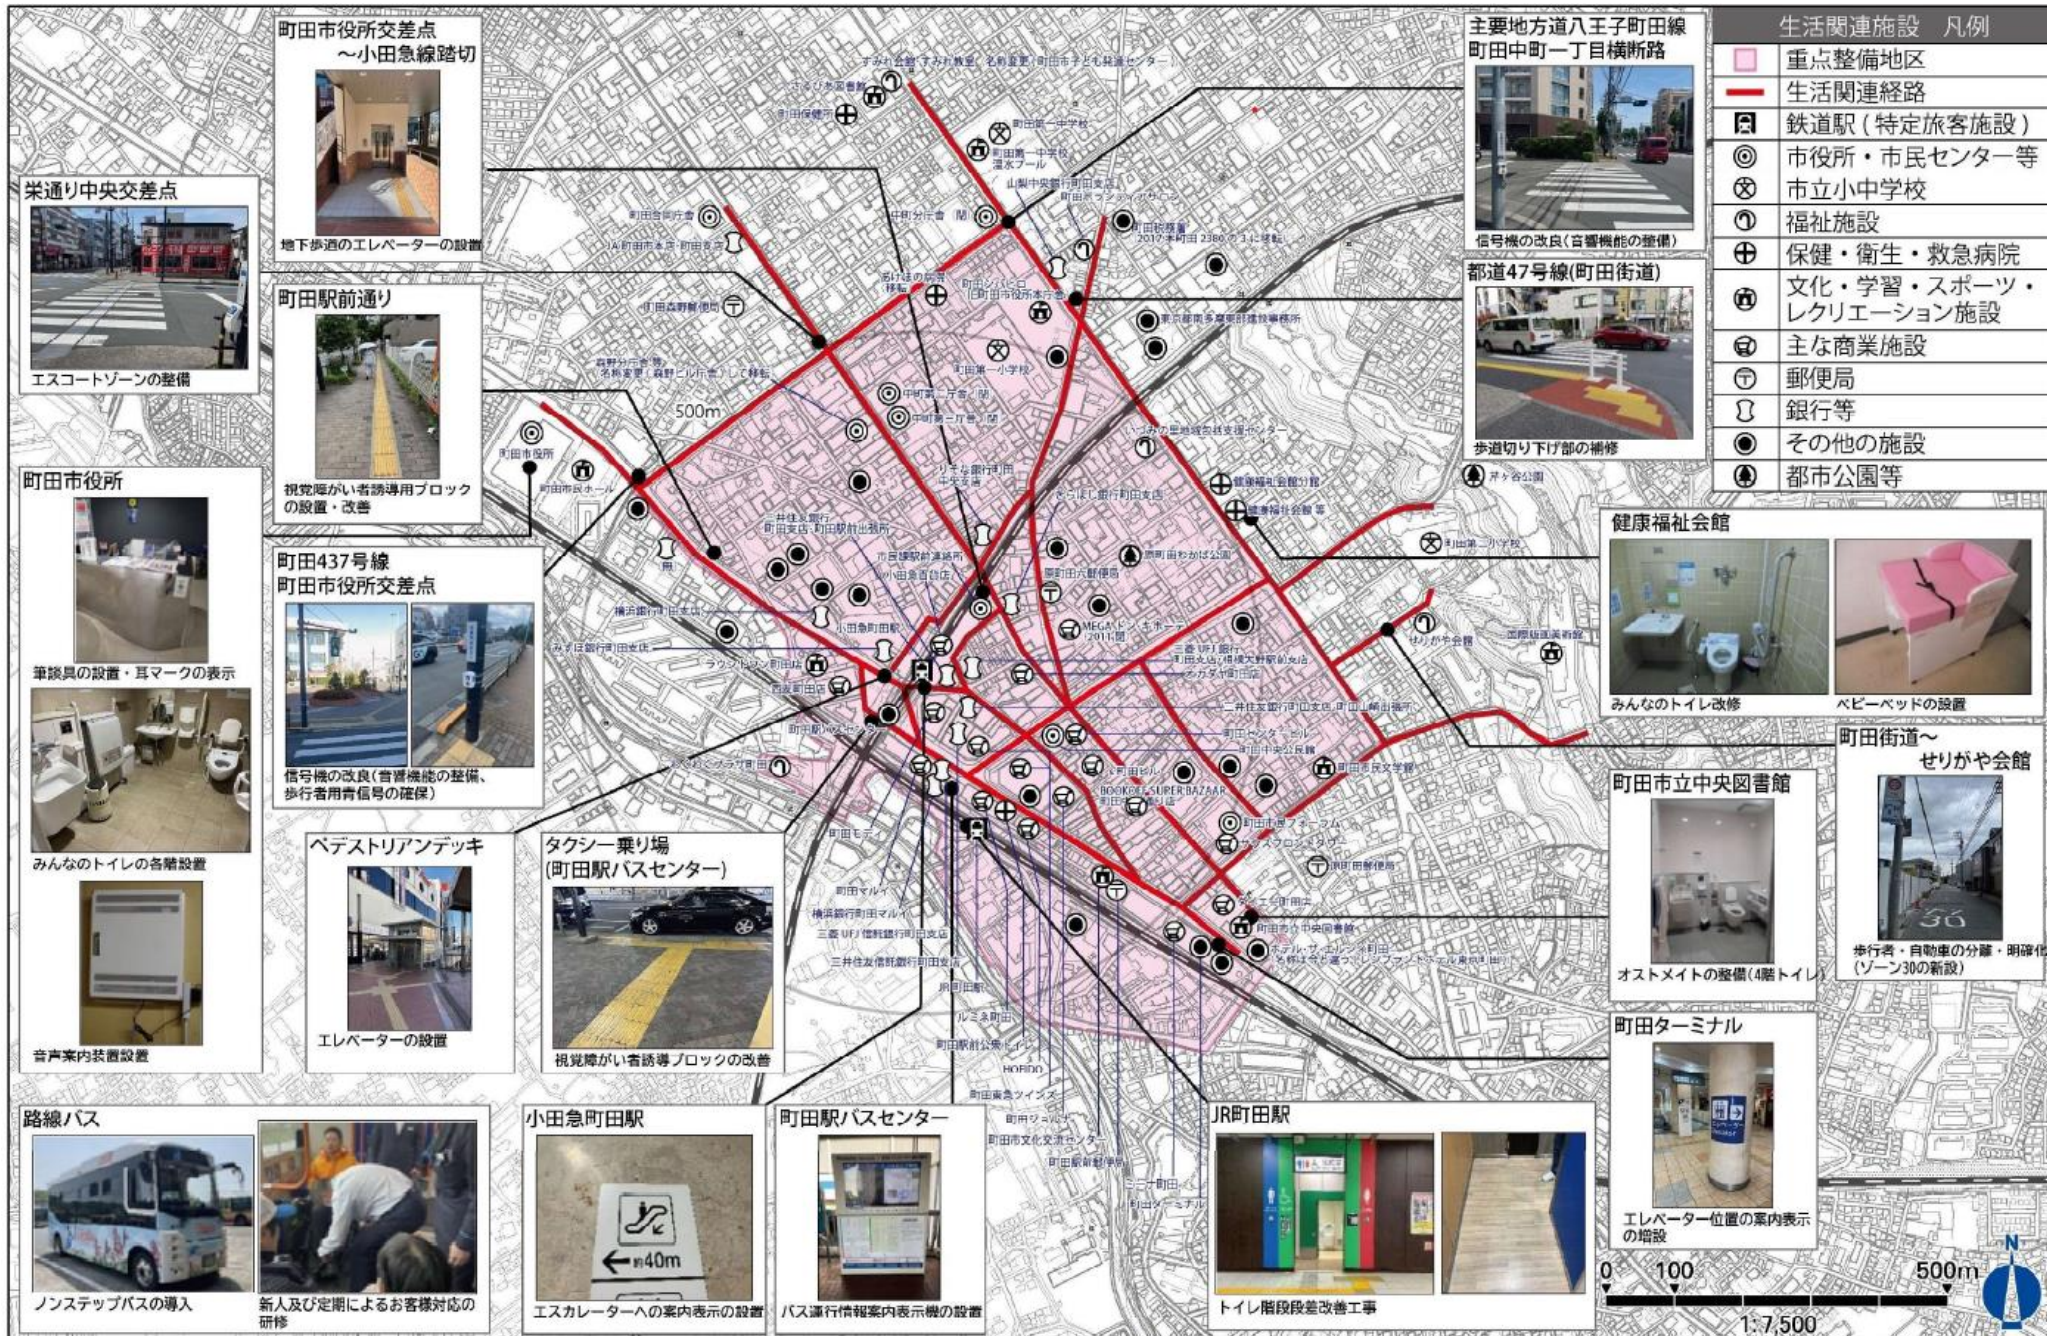

生活関連施設 凡例	
	重点整備地区
	生活関連経路
	鉄道駅 (特定旅客施設)
	市役所・市民センター等
	市立小中学校
	福祉施設
	保健・衛生・救急病院
	文化・学習・スポーツ・レクリエーション施設
	主な商業施設
	郵便局
	銀行等
	その他の施設
	都市公園等



町田市バリアフリー基本構想

地区別の特定事業の進捗率について

町田駅周辺地区 (2011年11月策定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	9	11	21	-	16	-
継続実施	(件)	5	-	-	-	4	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	-	-
検討中	(件)	-	-	2	4	1	-
未実施	(件)	1	4	-	-	-	-
進捗件数	(件)	14	11	21	0	20	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	14	11	21	0	20	-
進捗率	(%)	93.3%	73.3%	91.3%	0.0%	95.2%	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

鶴川駅周辺地区 (2013年3月策定)(2020年3月改定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	-	5	10	-	1	-
継続実施	(件)	5	-	2	-	1	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	-	-
検討中	(件)	-	-	3	-	-	-
未実施	(件)	-	4	-	-	-	-
進捗件数	(件)	5	5	12	-	2	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	5	5	12	-	2	-
進捗率	(%)	100.0%	55.6%	80.0%	-	100.0%	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

玉川学園前駅周辺地区 (2013年3月策定)(2019年3月改定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	-	10	3	-	-	-
継続実施	(件)	4	-	-	-	-	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	-	-
検討中	(件)	1	2	-	-	-	-
未実施	(件)	-	2	1	-	-	-
進捗件数	(件)	4	10	3	-	-	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	4	10	3	-	-	-
進捗率	(%)	80.0%	71.4%	75.0%	-	-	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

つくし野駅周辺地区 (2013年3月策定)(2019年3月改定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	2	6	-	-	-	-
継続実施	(件)	2	-	1	-	-	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	-	-
検討中	(件)	1	-	-	-	-	-
未実施	(件)	-	-	-	-	-	-
進捗件数	(件)	4	6	1	-	-	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	4	6	1	-	-	-
進捗率	(%)	80.0%	100.0%	100.0%	-	-	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

すずかけ台駅周辺地区(2013年3月策定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	2	11	-	-	3	-
継続実施	(件)	2	-	-	-	-	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	4	-
検討中	(件)	-	-	-	-	-	-
未実施	(件)	-	7	-	-	-	-
進捗件数	(件)	4	11	-	-	7	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	4	11	-	-	7	-
進捗率	(%)	100.0%	61.1%	-	-	100%	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

南町田駅周辺地区 (2013年3月策定)(2018年3月改定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	-	14	3	7	2	-
継続実施	(件)	2	-	3	-	-	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	-	-
検討中	(件)	1	-	3	-	-	-
未実施	(件)	-	3	1	-	-	-
進捗件数	(件)	2	14	6	7	2	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	2	14	6	7	2	-
進捗率	(%)	66.7%	82.4%	60.0%	100.0%	100.0%	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

相原駅周辺地区 (2013年12月策定)(2024年3月改定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	-	1	4	-	-	1
継続実施	(件)	1	-	-	-	-	16
適宜実施	(件)	-	-	-	-	3	-
検討中	(件)	-	3	-	-	-	-
未実施	(件)	2	5	11	-	-	1
進捗件数	(件)	1	1	4	-	3	17
完了+継続実施+適宜実施	(件)	1	1	4	-	3	17
進捗率	(%)	33.3%	11.1%	26.7%	-	100.0%	94.4%
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

多摩境駅周辺地区 (2013年12月策定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	3	8	3	-	4	-
継続実施	(件)	2	-	1	-	4	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	-	-
検討中	(件)	-	-	2	-	-	-
未実施	(件)	-	10	-	-	-	-
進捗件数	(件)	5	8	4	-	8	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	5	8	4	-	8	-
進捗率	(%)	100.0%	44.4%	66.7%	-	100.0%	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

山崎団地周辺地区 (2013年12月策定)

実施状況		特定事業					
		公共交通	道路	建築物	都市公園	交通安全	教育啓発
完了	(件)	1	2	6	-	-	-
継続実施	(件)	2	-	1	-	4	-
適宜実施	(件)	-	-	-	-	-	-
検討中	(件)	-	-	-	-	-	-
未実施	(件)	-	4	-	-	-	-
進捗件数	(件)	3	2	7	-	4	-
完了+継続実施+適宜実施	(件)	3	2	7	-	4	-
進捗率	(%)	100.0%	33.3%	100.0%	-	100.0%	-
<small>(完了+継続実施+適宜実施)/事業数</small>							

町田市バリアフリー基本構想 未実施の事業について

(1) 公共交通特定事業

未実施の理由	事業数	割合
関連計画・事業と調整が必要	3	50%
関連事業者等と調整が必要	1	17%
実施予定	2	33%
未実施事業数	6	100%

主な内容	
駅の段差解消	駅の大規模改修時に併せて実施を検討
駅に音響案内装置の整備	設置方法に関して関係部署と調整中
ホームドアの設置	2025年度整備予定

(4) 都市公園特定事業

未実施の理由	事業数	割合
他の計画・事業で進めている	4	100%
未実施事業数	4	100%

主な内容	
バリアフリー整備 (急傾斜解消、点字ブロック設置など)	公園の再整備事業の中で実施

(2) 道路特定事業

未実施の理由	事業数	割合
関連計画・事業と調整が必要	1	2%
関連事業者等と調整が必要	4	9%
構造的・空間的な問題がある	2	5%
土地等の権利関係上の問題がある	14	32%
他の計画・事業で進めている	22	50%
実施予定	1	2%
未実施事業数	44	100%

主な内容	
歩道の補修	無電柱化計画の進捗に併せて対応
踏切道に点字ブロック設置	設置時期について鉄道事業者と調整が必要
網目の細かいグレーチングに交換	冠水箇所のため詰まりの可能性を考慮し未実施
歩道の勾配の改善	工事に伴い民有地等に大きな影響がある
歩道のすりつけ勾配の改善	駅交通広場の改修に伴い実施
点字ブロックの設置・改善	3年以内に実施予定

(5) 交通安全特定事業

未実施の理由	事業数	割合
実施予定	1	100%
未実施事業数	1	100%

主な内容	
信号機の改良 (音響式信号機の整備など)	R8年度以降対応予定

(3) 建築物特定事業

未実施の理由	事業数	割合
関連計画・事業と調整が必要	6	26%
土地等の権利関係上の問題がある	1	4%
他の計画・事業で進めている	2	9%
実施予定	11	48%
その他	3	13%
未実施事業数	23	100%

主な内容	
点字ブロックの設置	公共施設再編構想の検討内容に合わせて対応
ベビーチェアの設置	建物オーナーより躯体に穴をあける事が禁止されている
施設内タイル滑り止め対策実施	建物の改修工事に併せて実施
車椅子使用者が利用しやすいカウンターの改修	R7年度実施予定
点字ブロック上の障害物の改善	対策実施により新たな問題が生じる可能性があるため対応内容を再検討

(6) 教育啓発特定事業

未実施の理由	事業数	割合
実施予定	1	100%
未実施事業数	1	100%

主な内容	
職員の心のバリアフリー意識向上のための教育啓発の実施	心のバリアフリーに関する研修受講予定 (R7年度)

未実施の事業・・・未着手及び着手済みだが未完了の事業
