


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	JR町田 駅	南口側通路における誘導用ブロックの改善	短期	石床改良工事時に誘導ブロック改善	東日本旅客鉄道株式会社	完了	2013年度		
2	公共交通 特定事業	JR町田 駅	ホームにおける安全な乗降の確保	適宜実施	駅係員によるバリアフリーやサービスについての勉強会実施	東日本旅客鉄道株式会社	継続実施中	—		・2024年度毎月1回勉強会を実施 ・勉強会の主なテーマ ・障害者差別解消法の学習 ・高齢者疑似体験 ・DID研修の開催 など ※DID(ダイアログ・イン・ザ・ダーク 暗闇での体験を通じた学習)
3	公共交通 特定事業	JR町田 駅	利用しやすいトイレへの改善	中期	トイレ階段段差改善工事	東日本旅客鉄道株式会社	完了	2018年度	 	


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
4	公共交通 特定事業	小田急町 田駅	利用しやすい出入 り口、改札口への改 善	長期	ホームから店舗に直結する階段 の手すりの改善	小田急電 鉄	完了	2023年 度		手すりを設置すると階段幅 員が狭くなるため反対側の 店舗直結のエスカレーター へ案内する掲示を階段部分 に設置
5	公共交通 特定事業	小田急町 田駅	利用しやすい出入 り口への改善	短期	北口出入口付近の床面・段差の 改善	道路政策 課	完了	2023年 度		歩道の段差については、歩 道補修に合わせて解消済み
6	公共交通 特定事業	小田急町 田駅	利用しやすい出入 り口、改札口への改 善	短期	通路の床面(タイル)の定期点検 と補修	小田急電 鉄	継続実施 中	—		定期的に点検を実施してい り、不具合等を発見した場 合は、随時補修を計画して いる。
7	公共交通 特定事業	小田急町 田駅	利用しやすい出入 り口、改札口への改 善	長期	段差の解消	小田急電 鉄	未実施	—		駅の大規模改修時に併せて 段差解消するなど検討す る。
8	公共交通 特定事業	小田急町 田駅	ホームにおける安 全な乗降の確保	適宜実施	傾斜の改善(傾斜2%以上のも のは床面に傾斜注意サイン表 示)	小田急電 鉄	完了	2015年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
9	公共交通 特定事業	従業員	ホームにおける安全な乗降の確保	適宜実施	お手伝いを必要とされるお客さまへの対応教育	小田急電鉄	継続実施中	—		例年下記二点について計画している ・お手伝いを必要とされるお客さまへの対応マニュアルを活用した係員教育を通じ、駅係員のサービスレベル向上を図る。 ・合理的配慮の義務化がなされたこと等を踏まえて、あらためて駅係員に向けた教育を実施する。
10	公共交通 特定事業	バスソフト施策	バス乗降時における安全性の確保	継続実施	ノンステップバスの導入	神奈川中央交通株式会社	継続実施中	—	 	【2024年度導入】 ・町田営業所7両(ノンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・多摩営業所7両(ノンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・大和営業所12両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・相模原営業所7両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) ・津久井営業所13両(ワンステップバス⇒ノンステップバス代替) 町田営業所および多摩営業所の大型バスは全車ノンステップバス導入済み。今後も代替車両はノンステップバスを継続購入する。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
11	公共交通 特定事業	バス ソフト施 策	バス乗降時におけ る安全性の確保	継続実施	新人及び定期によるお客様対 応の研修	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施 中	—		・各営業所において、月次に行う教育に高齢のお客様や障害をお持ちのお客様に対する接遇に関する座学や疑似体験教育を盛り込み、全乗務員が同水準で正しくスムーズな対応ができるよう訓練を行った。 (体験教育は10月および11月に実施)
12	公共交通 特定事業	町田市民 バスま ちっこ	バス乗降時におけ る安全性の確保	継続実施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	完了	2023年 度		現在3両全てノンステップ 今後も代替車両はノンス テップバスを継続購入する。 2024年3月25日からEV バス(ノンステップ仕様)の 運行を開始
13	公共交通 特定事業	町田バス センター	案内・サインの設 置・改善	—	バス運行情報案内表示機の設 置	町田市	完了	2014年度		3台設置

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
14	公共交通 特定事業	町田ターミナル	案内・サインの設置・改善	短期	エレベーター位置の案内表示の増設	町田市	完了	2014年度	 	
15	公共交通 特定事業	町田バスセンター	利用しやすいタクシー乗り場への改善	短期	視覚障がい者誘導ブロックの改善	町田市	完了	2011年度	 	路面と区別が付きやすい物に変更

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
16	道路特定事業	都道47号線(町田街道)	歩道切り下げ部におけるすりつけ勾配の改善	長期	バリアフリーのガイドラインに従い歩道切下げ部の補修	南多摩東部建設事務所(東京都)	未実施	—		当該区間は東京都無電柱化計画(改定:第8期)に位置付けられており、今後電線共同溝の整備を実施予定で、歩道舗装の本復旧に合わせてバリアフリーに対応していく(道路整備保全公社委託で実施予定で歩道の前出しを計画している)
17	道路特定事業	都道47号線(町田街道)	歩道切り下げ部におけるすりつけ勾配の改善	長期	バリアフリーのガイドラインに従い歩道切下げ部の補修	南多摩東部建設事務所(東京都)	完了	2015年度 2023年度	   	当該区間はR5年度に路面補修工事に併せて歩道舗装も実施しており、点字ブロックも設置し直している。また、輝度比が確保できていない点字ブロック設置箇所の薄層カラー舗装化、横断抑止柵を車両防護柵に交換するなど、更に改良している。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
18	道路特定事業	都道47号線(町田街道)	歩道切り下げ部におけるすりつけ勾配の改善	長期	バリアフリーのガイドラインに従い歩道切下げ部の補修	南多摩東部建設事務所(東京都)	完了	2020年度		町田街道の栄通り中央～森野交差点間が東京都バリアフリー推進計画の優先整備路線に位置付けられている。特定事業計画には生活関連経路に位置付けられた栄通り中央～合同庁舎までを追加。令和2年度に栄通り中央～森野交差点間の路面補修工事に合わせて歩道の勾配改善、段差解消、巻込み部の点字ブロックの設置を実施した。
19	道路特定事業	町田駅前通り	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	中期	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	町田市	完了	2012年度		
20	道路特定事業	町田駅前通り	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	中期	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	町田市	完了	2012年度		


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
21	道路特定事業	町田駅前通り	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	中期	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	町田市	未実施	—		歩道補修に合わせて実施予定のため、未実施。 なお、短期(2～3年以内)で歩道の補修工事を予定。
22	道路特定事業	町田駅前通り	縦断勾配の改善	短期	縦断勾配の改善	町田市	完了	2012年度		
23	道路特定事業	町田駅前通り	歩道切り下げ部におけるすりつけ勾配の改善	短期	歩道切り下げ部におけるすりつけ勾配の改善	町田市	完了	2012年度		
24	道路特定事業	町田市役所交差点～小田急線踏切	踏切の解消、歩行・横断経路の確保、地下横断歩道のバリアフリー化	短期	地下歩道のエレベーターの設置	町田市	完了	2010年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
25	道路特定事業	町田市役所交差点～小田急線踏切	踏切の解消、歩行・横断経路の確保、地下横断歩道のバリアフリー化	中期	手すりの設置(地下歩道)	町田市	未実施	—		地下歩道の改修に合わせて実施予定のため、未実施。
26	道路特定事業	町田街道～せりがや会館	歩行者通行路明確化(カラー舗装・路面標示)	中期	歩行者通行路明確化(カラー舗装・路面標示)	町田市	完了	2023年度		
27	道路特定事業	町田街道～せりがや会館	歩行者・自動車の分離・明確化	中期	自動車への注意喚起(ゾーン30の新設)	町田市	完了	2018年度		ゾーン30:生活道路における交通安全対策の1つで、区域を定めて最高速度を時速30キロメートルに規制するもの。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
28	道路特定事業	ペDESTリアンデッキ	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	短期	視覚障がい者誘導ブロックの設置・改善	町田市	完了	2016年度		
29	道路特定事業	ペDESTリアンデッキ	小田急線高架下デッキのスロープの幅員の改善	中期	小田急線高架下デッキのスロープの幅員の改善	町田市	未実施	—	  	鉄道施設や既存デッキの高さ、デッキ下の建築限界の確保等、物理的な制約があり、対応方法が未決定のため、未実施。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
30	道路特定事業	ペDESTリアンデッキ	町田横断歩道橋西側へのエレベーターの設置	短期	町田横断歩道橋西側へのエレベーターの設置	町田市	完了	2013年度		
31	建築物特定事業	町田市庁舎	(受付) 筆談具の設置・耳マークの表示・案内人の常駐	—	(受付) 筆談具の設置・耳マークの表示・案内人の常駐	町田市	完了	2012年度		

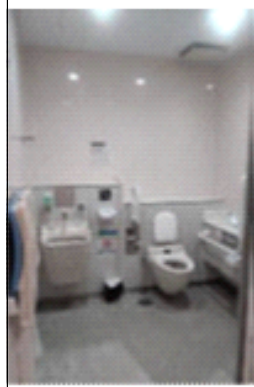
基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
32	建築物特定事業	町田市庁舎	(昇降施設) エレベーターの設置 (点字ボタン整備・音声案内あり)	—	(昇降施設) エレベーターの設置(点字ボタン整備・音声案内あり)	町田市	完了	2012年度		
33	建築物特定事業	町田市庁舎	(トイレ) みんなのトイレの各階設置 (うち音声案内対応5箇所・オストメイト対応6箇所)	—	(トイレ) みんなのトイレの各階設置 (うち音声案内対応5箇所・オストメイト対応6箇所)	町田市	完了	2012年度		
34	建築物特定事業	町田市庁舎	(庁舎入口) 誘導通路に点字ブロック設置	—	(庁舎入口) 誘導通路に点字ブロック設置	町田市	完了	2012年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
35	建築物特定事業	町田市庁舎	(庁舎入口)音声案内装置設置	—	(庁舎入口)音声案内装置設置	町田市	完了	2012年度		
36	建築物特定事業	生涯学習センター(まちだ中央公民館)	(公衆電話)車いす使用者が利用しやすいよう公衆電話設置台を改善	—	(公衆電話)車いす使用者が利用しやすいよう公衆電話設置台を改善	町田市	完了	2014年度		令和2年に公衆電話は撤去
37	建築物特定事業	生涯学習センター(まちだ中央公民館)	(1階ビル出入口)共有部分であるビルの出入口階段滑り止めを修繕	—	(1階ビル出入口)共有部分であるビルの出入口階段滑り止めを修繕	町田市	完了	2014年度		2015年(H27)3月に修繕を行い、滑り止めを設置。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
38	建築物特定事業	町田市民ホール	(トイレ) 多目的トイレ内にオストメイトが設置されていないため、隣接する町田市役所のトイレを案内	—	(トイレ) 多目的トイレ内にオストメイトが設置されていないため、隣接する町田市役所のトイレを案内	町田市	完了	2012年度	 町田市役所 みんなのトイレ	
39	建築物特定事業	町田市民ホール	(受付) 正面玄関と事務所で筆談具を提供	—	(受付) 正面玄関と事務所で筆談具を提供	町田市	完了	2014年度		※筆談対応も可(町田市バリアフリーマップより)

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
40	建築物特定事業	中央図書館	(廊下) エレベーター前とエスカレーター付近に点字ブロック増設	—	(廊下) エレベーター前とエスカレーター付近に点字ブロック増設	町田市	完了	2012年度	 	
41	建築物特定事業	中央図書館	(奉仕ルーム隣トイレ) 故障したみんなのトイレのウォシュレットを修理	—	(奉仕ルーム隣トイレ) 故障したみんなのトイレのウォシュレットを修理	町田市	完了	2013年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
42	建築物特定事業	中央図書館	(5階床) 床埋め込み式非常灯の段差をなだらかにする	—	(5階床) 床埋め込み式非常灯の段差をなだらかにする	町田市	完了	2014年度		
43	建築物特定事業	中央図書館	(全館) 図書館システム更改にあわせ、館内表示を見やすいものにする	—	(全館) 図書館システム更改にあわせ、館内表示を見やすいものにする	町田市	完了	2014年度	 	

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
44	建築物特定事業	中央図書館	(4階トイレ) オストメイトの整備	—	(4階トイレ) オストメイトの整備	町田市	完了	2016年度		2016年12月～2017年2月に4階トイレ改修工事を行い、4階みんなのトイレにオストメイトを1基設置。
45	建築物特定事業	中央図書館	(5階、6階トイレ) オストメイトの整備	—	(5階、6階トイレ) オストメイトの整備	町田市	完了	2018年度		2018年11月～2019年2月に5階及び6階トイレ改修工事を行い、オストメイト1基を5階みんなのトイレに設置。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
46	建築物特定事業	せりがや会館	館内に様々な表示を設置	—	館内に様々な表示を設置	町田市	完了	2012年度	 会館入口案内看板(新設)  事業所の階数を明示	会館入口に看板を設置。市の委託事業で運営する事業所の階数を明示。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
47	建築物特定事業	せりがや会館	館内使用団体に対し、会館有効活用にむけたアンケートを実施	—	館内使用団体に対し、会館有効活用にむけたアンケートを実施	町田市	完了	2014年度		会館の有効かつ円滑な利用を促進するため。
48	建築物特定事業	せりがや会館	管理事務所から会館利用団体に対するお知らせ等を掲示する掲示板を設置	—	管理事務所から会館利用団体に対するお知らせ等を掲示する掲示板を設置	町田市	完了	2015年度		会館の有効かつ円滑な利用を促進するため。
49	建築物特定事業	健康福祉会館	(廊下) 階段に近接する部分に点状ブロックの敷設	—	(廊下) 階段に近接する部分に点状ブロックの敷設	町田市	検討中	—	 	点字ブロックは敷設されているが、床との明度差・輝度比がない。再敷設に向けた検討が必要だが、公共施設再編構想において、健康福祉会館についての方針が検討中のため、その内容に合わせて対応する。
50	建築物特定事業	健康福祉会館	(トイレ) みんなのトイレ改修、一般トイレの一部洋式化、ベビーチェア・ベビーベッドの設置	—	(トイレ) みんなのトイレ改修、一般トイレの一部洋式化、ベビーチェア・ベビーベッドの設置	町田市	完了	2015年度		

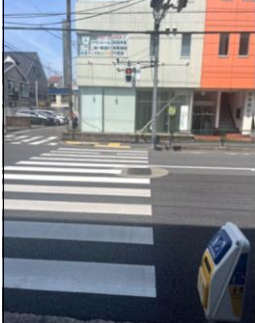
基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
51	建築物特定事業	健康福祉会館	(授乳室) ベビーシート・カーテンレール設置	—	(授乳室) ベビーシート・カーテンレール設置	町田市	完了	2015年度	 	
52	建築物特定事業	健康福祉会館	(昇降施設) かご内に到着階等を知らせる音声装置を設置する	—	(昇降施設) かご内に到着階等を知らせる音声装置を設置する	町田市	完了	2015年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
53	建築物特定事業	健康福祉会館	(出入口) 点状ブロックの敷設箇所の修正	—	(出入口) 点状ブロックの敷設箇所の修正	町田市	検討中	—		出入口に点字ブロックは敷設されているが、2016年6月1日の調査で敷設箇所について指摘を受け、新たな整備事項とした。公共施設再編構想において、健康福祉会館についての方針が検討中のため、その内容に合わせて対応する。
54	都市公園特定事業	芹ヶ谷公園	(出入口・園路・階段・傾斜路) 公園内全域(出入口の急傾斜の解消、園路踊り場の適正配置、園路手すり及び立上り設置、階段形状の変更、傾斜路の有効幅確保、傾斜路の緩勾配化及び立上り部設置)	—	(出入口・園路・階段・傾斜路) 公園内全域(出入口の急傾斜の解消、園路踊り場の適正配置、園路手すり及び立上り設置、階段形状の変更、傾斜路の有効幅確保、傾斜路の緩勾配化及び立上り部設置)	町田市	検討中	—		R7年度(2025年度)に第2期整備区域の実施設計 R8年度(2026年度)に第2期整備区域の整備工事 R9年度(2027年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)以降に第3期整備区域の整備検討を行う。
55	都市公園特定事業	芹ヶ谷公園	(転落防止等) 公園内全域(視覚障がい者誘導ブロック設置)	—	(転落防止等) 公園内全域(視覚障がい者誘導ブロック設置)	町田市	検討中	—		R7年度(2025年度)に第2期整備区域の実施設計 R8年度(2026年度)に第2期整備区域の整備工事 R9年度(2027年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)以降に第3期整備区域の整備検討を行う。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
56	都市公園 特定事業	芹ヶ谷公園	(休憩所・管理事務所) 公園内全施設(休憩所・管理施設の段差解消及び有効幅確保、踊り場の適正配置、手すり設置、路面の滑り防止処理、有効スペースの確保等)	—	(休憩所・管理事務所) 公園内全施設(休憩所・管理施設の段差解消及び有効幅確保、踊り場の適正配置、手すり設置、路面の滑り防止処理、有効スペースの確保等)	町田市	検討中	—		R7年度(2025年度)に第2期整備区域の実施設設計 R8年度(2026年度)に第2期整備区域の整備工事 R9年度(2027年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)以降に第3期整備区域の整備検討を行う。
57	都市公園 特定事業	芹ヶ谷公園	(便所・案内表示) 公園内全施設(便所勾配の緩傾斜化及び手すり設置、オストメイト対応便房設置等、案内標識の明確化及び多言語表記)	—	(便所・案内表示) 公園内全施設(便所勾配の緩傾斜化及び手すり設置、オストメイト対応便房設置等、案内標識の明確化及び多言語表記)	町田市	検討中	—		R7年度(2025年度)に第2期整備区域の実施設設計 R8年度(2026年度)に第2期整備区域の整備工事 R9年度(2027年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)に第2期整備区域の整備工事 R10年度(2028年度)以降に第3期整備区域の整備検討を行う。
58	交通安全 特定事業	町田437号線 町田市民ホール横断路	信号機の改良(音響機能の整備、歩行者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公安委員会	完了	2015年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
59	交通安全 特定事業	町田43 7号線 町田市民 ホール横 断路	横断歩道の整備	長期	横断歩道の整備	東京都公 安委員会	完了	2012年度		
60	交通安全 特定事業	町田43 7号線 町田市役 所交差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2013年度	 	
61	交通安全 特定事業	町田43 7号線 森野一丁 目横断路	信号機の改良(歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2015年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
62	交通安全 特定事業	町田57 7号線 JR町田 駅横断路	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2020年 度		
63	交通安全 特定事業	町田57 7号線 町田バス ターミナル西横断 路	信号機の改良(歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2015年度		
64	交通安全 特定事業	町田57 7号線 町田バス ターミナル交差点	信号機の改良(歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2015年度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
65	交通安全 特定事業	町田90 0号線 浄運寺前 交差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2014年度		
66	交通安全 特定事業	町田37 号線 町田中央 通り交差 点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2023年 度		
67	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 町田保健 所入口交 差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2016年度		
68	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 町田市立 第一中学 校前横断 路	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2014年度		


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
69	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 町田一中 角交差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2014年度		
70	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 町田税務 署入口交 差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2014年度		町田市役所前西交差点から 最新の交差点名称に修正
71	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 中町交番 前交差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	検討中	—		R08以降対応予定
72	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 町田福祉 会館前交 差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2014年度		
73	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 町田中町 一丁目横 断路	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2016年度		


基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
74	交通安全 特定事業	主要地方 道八王子 町田線 栄通り中 央交差点	信号機の改良(音響 機能の整備、歩行 者用青信号の確保)	長期	信号機の改良	東京都公 安委員会	完了	2016年度		
75	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべ て	道路標識及び道路 標示の設置に関す る事業 (1)道路標識の超 高輝度化による視 認性向上 必要に応じて実 施(道路標識の高輝 度化は既に実施済)	適宜実施	—	東京都公 安委員会	継続実施 中	—		
76	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべ て	(2)道路標示の適 切な補修 必要に応じて実 施(道路標示の高輝 度化は既に実施済)	適宜実施	—	東京都公 安委員会	継続実施 中	—		
77	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべ て	(3)エスコートゾ ンの整備 必要に応じて実施	適宜実施	—	東京都公 安委員会	継続実施 中	確認中		栄通り中央交差点へエ スコートゾーン設置

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
78	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	違法駐車行為の防止のための事業 (1)横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施 (2)歩道及び視覚障がい者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車指導取締りの実施 (3)違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施	適宜実施	—	東京都公安委員会	継続実施中	—		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	鶴川駅	【改札口・券売機】 昼間の照明点灯	短期	時間帯・天候を考慮した昼間の 照明点灯	小田急電 鉄株式会 社	継続実施	—		駅改良に合わせて撤去される 予定。 当面の間は、天候等で薄暗 いときは早期に点灯するよ う対応を行う。 ※弱視や老眼の方も見やす い明るさを保つための対策
2	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		【2024年度導入】 ・町田営業所7両(ノンステッ プバス⇒ノンステップバス代 替) 町田営業所および多摩営業 所の大型バスは全車ノンス テップバス導入済み。今後も 代替車両はノンステップバス を継続購入する。
3	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	継続実施	新人及び定期によるお客様対応 の研修	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—	 	各営業所において、月次に行 う教育に高齢のお客様や障 がいをお持ちのお客様に対 する接遇に関する座学や疑 似体験教育を盛り込み、全 乗務員が同水準で正しくス ムーズな対応ができるよう 訓練を行った。 (体験教育は10月および11 月に実施)
4	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実施	ノンステップバスの導入	小田急バ ス株式会 社	継続実施	—		すでに全車両がノンステップ バスとなっているが、今後も 代替車両はノンステップバス を導入する。
5	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	継続実施	新人研修及び定期研修によるお 客様対応スキルの習得	小田急バ ス株式会 社	継続実施	—		全運転士に対して、利用者へ の適切な接客や乗車支援に 関するおもてなし・技術教育 を継続して実施する。年4回 の安全運転講習会や新人運 転士入社後、及び入社後6か 月、また入社後1年において も研修を実施。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
6	道路特定事業	鶴川駅前	視覚障がい者用誘導用ブロックの適切な維持管理 ※路面から浮いている箇所がある	中期	視覚障がい者用誘導用ブロックの適切な維持管理	町田市	未実施	—		鶴川駅北口交通広場改修に伴い改善する予定。
7	道路特定事業	鶴川駅前	視覚障がい者用誘導用ブロックの適切な維持管理 ※仕様が古い	中期	視覚障がい者用誘導用ブロックの適切な維持管理	町田市	未実施	—		鶴川駅北口交通広場改修に伴い改善する予定。
8	道路特定事業	鶴川駅前	駐車場前の視覚障がい者誘導用ブロックの補修	中期	破損個所の修繕	町田市	完了	2022年度		
9	道路特定事業	鶴川駅前	歩道切り下げ部におけるすりつけ勾配の改善	中期	歩道切り下げ部におけるすりつけ勾配の改善	町田市	未実施	—		鶴川駅北口交通広場改修に伴い改善する予定。
10	道路特定事業	鶴川駅前	横断側溝の凹凸の改善 利用者の安全確保	短期	横断側溝の凹凸の改善 利用者の安全確保	町田市	完了	2022年度		
11	道路特定事業	鶴川市民センター前道路(鶴川市民センター前交差点～鶴川団地周辺)	歩道と車両出入口とのすりつけ勾配の改善	中期	歩道と車両出入口とのすりつけ勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の切り下げ部の改善は、隣接地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
12	道路特定事業	鶴川市民センター前道路(鶴川市民センター前交差点～鶴川団地周辺)	歩道切り下げ部の改善	中期	歩道切り下げ部の改善	町田市	完了	2022年度		
13	道路特定事業	鶴川市民センター前道路(鶴川市民センター前交差点～鶴川団地周辺)	歩道の舗装改善	短期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2016年度		
14	道路特定事業	鶴川市民センター前道路(鶴川市民センター前交差点～鶴川団地周辺)	歩道の舗装改善	短期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2016年度		
15	建築物特定事業	和光大学ポプリホール鶴川	【駐車場】 障がい者用駐車場の位置が分かりづらい、スペースが狭い。	長期	障がい者用駐車区画の改善	町田市	完了	2019年度		障がい者等用駐車区画であることをより識別しやすくするため、床面全体を青色に塗装した。また、乗降スペースを確保し、床面に斜線を塗装した。あわせて歩行者の安全性を高めるため、車止めを移設した。
16	建築物特定事業	鶴川市民センター	【受付】 高齢者・障がい者との接し方研修の受講	適宜実施	高齢者・障がい者との接し方研修の受講	町田市	継続実施	—		2025.2.4「障がい者雇用に関する理解促進」研修受講

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
17	建築物特定事業	鶴川市民センター	【消防訓練】 施設利用中の車椅子使用の利用者の避難誘導を含む消防訓練の実施	適宜実施	施設利用中の車椅子使用の利用者の避難誘導を含む消防訓練の実施	町田市	継続実施	—		2021年12月10日、 2022年11月16日 消防訓練実施
18	建築物特定事業	鶴川市民センター	【トイレ】 大規模改修時に、和式トイレを洋式トイレに改修	中期	大規模改修時に、和式トイレを洋式トイレに改修	町田市	完了	2016年度		
19	建築物特定事業	子どもセンターつるっこ	【標識】 日本工業規格に適合した駐車場案内を設置	短期	日本工業規格に適合した駐車場案内を設置	町田市	完了	2015年度		
20	建築物特定事業	子どもセンターつるっこ	【案内設備】 エレベーターの案内表示、館内の案内図を設置	中期	エレベーターの案内表示、館内の案内図を設置	町田市	完了	2016年度		
21	建築物特定事業	子どもセンターつるっこ	【受付】 筆談具の設置、耳マークの掲示	短期	筆談具の設置、耳マークの掲示	町田市	完了	2015年度		
22	建築物特定事業	ふれあいちょう館	【階段】 階段幅・踏面の対応	中期	階段幅・踏面の対応	町田市	完了	2016年度		福祉のまちづくり総合推進 条例の整備基準に適合 <基準> 幅120cm以上、 踏面26cm以上 <現況> 幅120cm、踏 面27cm



基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
23	建築物特定事業	ふれあい いちょう 館	【便所】 水洗器具(オストメイト対応)を設けた 便所の設置	長期	水洗器具(オストメイト対応)を 設けた便所の設置	町田市	検討中	—		修繕や改修工事を実施する 際に、オストメイト対応の整 備を検討していく。
24	建築物特定事業	ふれあい いちょう 館	【標識】 内容が容易に識別 できる標識の設置 (日本工業規格 Z8210適合)	中期	内容が容易に識別できる標識の 設置(日本工業規格Z8210適 合)	町田市	完了	2017年 度		みんなのトイレ等の標識を設 置
25	建築物特定事業	ふれあい いちょう 館	【案内設備までの経 路】 道路から施設入口 までの視覚障がい 者誘導用線状ブ ロックの敷設	長期	道路から施設入口までの視覚障 がい者誘導用線状ブロックの敷 設	町田市	検討中	—		修繕や改修工事を実施する 際に、視覚障がい者誘導用 線状ブロックの敷設を検討 していく。
26	建築物特定事業	ふれあい いちょう 館	【機能回復訓練室】 スカイウェル(交流 高圧電位治療器) の買換え	中期	スカイウェル(交流高圧電位治療 器)の買換え	町田市	完了	2017年 度		段差が無いものに買い替え
27	建築物特定事業	ふれあい いちょう 館	【囲碁将棋室前】 入口部分の段差解 消	長期	入口部分の段差解消	町田市	検討中	—		修繕や改修工事を実施する 際に、入口部分の段差の解 消を検討していく。
28	建築物特定事業	ふれあい いちょう 館	【受付】 コミュニケーション 支援ボードの設置	短期	コミュニケーション支援ボードの 設置	町田市	完了	2015年 度		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
29	建築物特定事業	ふれあい いちよう 館	【受付】 老眼鏡の設置	短期	老眼鏡の設置	町田市	完了	2015年 度		
30	交通安全 特定事業	主要地方 道世田谷 町田線 (第3号)	信号機の改良(音響 機能の整備)	短期	信号機の改良(音響機能の整備)	東京都公安委員会	完了	2019年 度	 	鶴川駅東口交差点:信号機の整備(R01完了)
31	交通安全 特定事業	生活関連 経路すべて	違法駐車行為の防止のための事業 (1)横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施 (2)歩道及び視覚障がい者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車等の違法駐車等の指導取締りの実施 (3)違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施	適宜実施	違法駐車行為の防止のための事業 (1)横断歩道及びバス停留所付近の違法駐車車両の指導取締りの実施 (2)歩道及び視覚障がい者誘導用ブロック上の自動二輪車等の違法駐車等の指導取締りの実施 (3)違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動の実施	東京都公安委員会	継続実施	—		

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
1	公共交通 特定事業	玉川学園 前駅	【出入口】 視覚障がい者誘導 用ブロックの改善	長期	床面タイルもしくは誘導ブロッ ク色彩の改善	小田急電 鉄株式会 社	検討中	—		床面タイルの改善につ いては、大規模な駅改修時 に合わせて行うことを検 討していく。 誘導ブロックの改修につ いては、(色変更)にて対 応する場合がある。
2	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実 施	ノンステップバスの導入	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		【2024年度導入】 ・町田営業所7両(ノンス テップバス⇒ノンステップ バス代替) 町田営業所および多摩営 業所の大型バスは全車ノ ンステップバス導入済み。 今後も代替車両はノンス テップバスを継続購入す る。
3	公共交通 特定事業	路線バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	継続実 施	新人及び定期によるお客様対応 の研修	神奈川中 央交通株 式会社	継続実施	—		・各営業所において、月次 に行う教育に高齢のお客 様や障がいをお持ちのお 客様に対する接遇に関す る座学や疑似体験教育を 盛り込み、全乗務員が同 水準で正しくスムーズな 対応ができるよう訓練を 行った。 (体験教育は10月および 11月に実施)
4	公共交通 特定事業	玉ちゃん バス	バス乗降時におけ る安全性の確保	適宜実 施	ノンステップバスの導入	小田急バ ス株式会 社	継続実施	—		すでに全車両がノンステッ プバスとなっているが、今 後においても代替車両は ノンステップバスを継続購 入する。

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取り組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
5	公共交通 特定事業	玉ちゃん バス	バス乗降時における安全性の確保	継続実施	新人研修及び定期研修によるお客様対応スキルの習得	小田急バス株式会社	継続実施	—		全運転士に対して、利用者への適切な接客や乗車支援に関するおもてなし・技術教育を継続して実施する。年4回の安全運動講習会や新入運転士入社後、および入社後6ヶ月、また入社後1年において研修を実施。
6	道路特定 事業	デッキ	視覚障がい者誘導用ブロックの整備	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの整備	町田市	完了	2021年度		
7	道路特定 事業	デッキ	歩道部を耐滑性の素材で整備	短期	歩道部を耐滑性の素材で整備	町田市	完了	2021年度		
8	道路特定 事業	デッキ	エレベータ内に凸面鏡を設置	短期	エレベータ内に凸面鏡を設置	町田市	完了	2021年度		
9	道路特定 事業	玉川学園 前駅北口 道路	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの改善	町田市	完了	2023年度		
10	道路特定 事業	玉川学園 前駅北口 道路	視覚障がい者誘導用ブロックの設置	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの設置	町田市	検討中	—		設置想定箇所が道路区域外(小田急電鉄所有地)のため、小田急電鉄と引き続き協議が必要である。 ※タクシー乗り場への誘導用ブロック

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
11	道路特定事業	玉川学園前駅北口道路	視覚障がい者誘導用ブロックの設置	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの設置	町田市	完了	2022年度		※コミュニティバス乗り場への誘導用ブロック
12	道路特定事業	玉川学園前駅北口道路	視覚障がい者誘導用ブロックの設置	短期	視覚障がい者誘導用ブロックの設置	町田市	完了	2023年度		※駅と反対側の歩道の誘導用ブロックの整備
13	道路特定事業	玉川学園前駅北口道路	既存の手すりの改善	中期	既存の手すりの改善	町田市	完了	2024年度		
14	道路特定事業	玉川学園前駅北口道路	勾配および段差の改善	短期	勾配および段差の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施
15	道路特定事業	玉川学園前駅北口道路	歩道の舗装改善	中期	歩道の舗装改善	町田市	完了	2024年度		
16	道路特定事業	玉川学園前駅北口道路	交差部の切り下げ勾配の改善	短期	交差部の切り下げ勾配の改善	町田市	未実施	—		歩道の勾配の改善は、民有地等に大きな影響を及ぼすことや、路線全体を改善するために大規模な工事が必要となることから未実施

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
17	道路特定事業	玉川学園前駅北口道路	注意喚起看板の設置	短期	注意喚起看板の設置	町田市	検討中	—		歩道空間の安全性確保に向けて、鶴川5号踏切の拡幅事業を実施する予定。
18	道路特定事業	玉川学園・玉川大学大グランド前道路	路側帯のカラー化	短期	路側帯のカラー化	町田市	完了	2021年度		
19	道路特定事業	玉川学園前駅南口側道	路側帯のカラー化	短期	路側帯のカラー化	町田市	完了	2021年度		
20	建築物特定事業	玉川学園コミュニティセンター	バリアフリー改善が目的の一つとなる、建替事業	短期	バリアフリー改善が目的の一つとなる、建替事業	町田市	完了	2021年度	  	建替え事業完了。2021年5月にリニューアルオープン ①エレベーター設置 ②地下1階、1階、2階にみんなのトイレ設置 ③出入り口に音声誘導装置設置 ④貸出施設に磁気ループ設置 ⑤正面入り口に触地図(音声案内)設置 ⑥障がい者用駐車区画およびおもいやり駐車区画設置
21	建築物特定事業	玉川学園子どもクラブこころ児童館	ベビーチェアの設置	長期	ベビーチェアの設置	町田市	未実施	—		対応不可(東京都から躯体に穴をあけることを禁じられているため未設置) ※建物は東京都の所有

基本構想の記載内容					特定事業計画(基本構想に基づく実施主体の取組み内容)					
NO	事業種別	対象箇所	特定事業内容	整備時期	実施内容	実施主体	実施状況	完了時期	整備写真 ※未整備は現況	備考
22	建築物特定事業	玉川学園子どもクラブこころ児童館	館内の案内図を設置	短期	館内の案内図を設置	町田市	完了	2016年度		
23	建築物特定事業	玉川学園子どもクラブこころ児童館	筆談具の設置、耳マークの掲示	短期	筆談具の設置、耳マークの掲示	町田市	完了	2016年度		
