

町田市下水道アクションプラン（2012年度～2016年度）
5ヶ年の評価説明資料【変動箇所抜粋】

施策Ⅰ-1 住環境の改善

○事業1 未整備箇所の污水管整備の促進

指標	実績値	内容	目標達成状況	評価
人口普及率 基準値：97.1% 目標値：98.1%	98.6%	①整備面積 144.9ha ②整備延長 29.3km (2月時点→145ha、29.4km)	150%	◎

○事業2 未接続家屋への污水管接続の指導

指標	実績値	内容	目標達成状況	評価
公共下水道接続率 基準値：96.1% 目標値：98.0%	98.6% (2月時点→98.3%)	下水道接続 約14,000世帯 (2月時点→約11,000世帯)	132% (2月時点→116%)	◎

施策Ⅰ-2 工場、事業場への指導

○事業7 工場、事業場への指導

指標	実績値	内容	目標達成状況	評価
—	聞き取り調査及び 排水検査実施、 水質改善指導の実施	排水検査実施件数 193事業場 (2月時点→190事業場)	維持可	○

施策Ⅰ-3 地球温暖化対策と資源の循環利用

○事業9 高温焼却対応型焼却炉への更新

指標	実績値	内容	目標達成状況	評価
N ₂ OのCO ₂ 換算排出量 基準値：13,074 t/年 目標値：約10,000 t/年	9,581 t/年 (2月時点→ 約10,000t/年)	成瀬クリーンセンター高 温焼却対応型焼却炉 (2号炉) 設置・本稼働	114% (2月時点→100%)	◎

○事業14 資源（処理水、汚泥等）のニーズの調査と有効利用の推進

指標	実績値	内容	目標達成状況	評価
—	焼却灰や沈砂汚泥の再資源化の 推進、再資源化率の向上に向け た廃棄物搬出先の複数化	産業廃棄物（焼却灰・沈砂汚 泥）の再資源化率 98.3% (2月時点→98.5%)	発展	◎

施策Ⅱ-1 浸水対策の推進

○事業20 民間による雨水貯留・浸透施設の整備促進





指標	実績値	内容	目標達成状況	評価
—	開発行為及び中高層協議に基づく貯留施設の指 導、排水設備計画確認申請時の雨水浸透ますの 指導及び雨水浸透施設設置助成事業開始	雨水流出抑制施設 設置指導 38箇所 (2月時点→32箇所)	発展	◎

施策Ⅲ-1 効率的・効果的な維持管理の推進

○事業33 耐震機能を付加した下水道管の延命化

指標	実績値	内容	目標達成状況	評価
①污水管更新延長 基準値：— 目標値：6.0 km	①污水管更新延長 1.8 km (2月時点→1.5 km)	下水道管カメラ 調査（つくし野 地区）、更正工事	75% (2月時点→63%)	△
②マンホール蓋更新率 基準値：8.0% 目標値：20.0%	②污水管の更新に併せ たマンホール蓋の 更新			

類似団体との比較

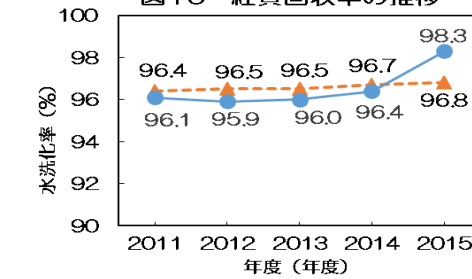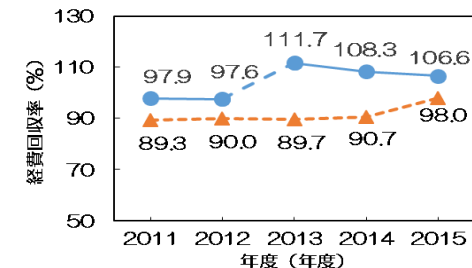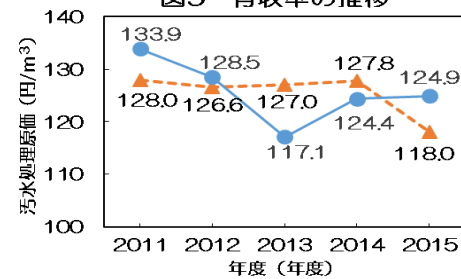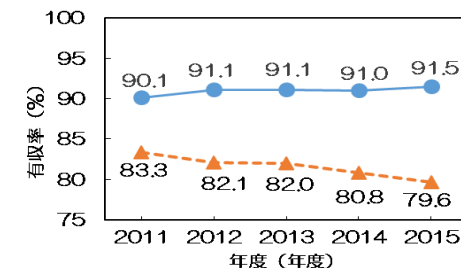

財政見通しと決算

○歳入

	AP策定時 見通し	2016年度 決算		5ヶ年 事業費計	年平均	比率
		最終確定値	2月時点			
a) 受益者負担金	0.1億円	0.4億円	0.3億円	3.2億円	0.6億円	0.6%
b) 下水道使用料	57.1億円	55.4億円	55.1億円	273.2億円	54.6億円	49.6%
c) 国費	13.8億円	12.8億円	9.1億円	51.9億円	10.4億円	9.4%
d) 都費	0.7億円	0.7億円	0.5億円	2.7億円	0.5億円	0.5%
e) 一般会計繰入金	24.5億円	19.5億円	20.4億円	103.9億円	20.8億円	18.9%
f) 市債	23.4億円	18.8億円	27.4億円	85.1億円	17.0億円	15.5%
g) その他	0.4億円	3.4億円	3.1億円	30.1億円	6.0億円	5.5%
合 計	120.0億円	111.0億円	115.9億円	550.1億円	—	100.0%

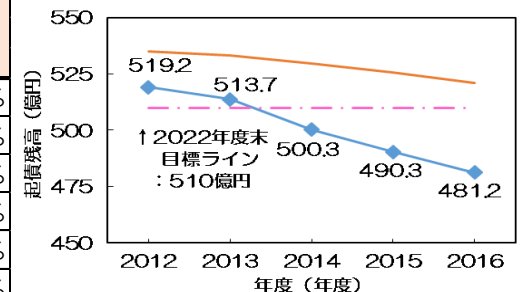


図35 起債残高の推移

○歳出

	AP策定時 見通し	2016年度 決算		5ヶ年 事業費計	年平均	比率
		最終確定値	2月時点			
h) 管渠建設費	22.5億円	13.9億円	15.7億円	92.7億円	18.5億円	17.6%
i) 処理場整備費	21.6億円	21.1億円	24.9億円	70.5億円	14.1億円	13.4%
j) 管渠維持管理費	4.2億円	5.5億円	4.9億円	25.4億円	5.1億円	4.8%
k) 処理場管理費	16.1億円	14.2億円	14.9億円	73.5億円	14.7億円	14.0%
l) 下水道総務費等	15.6億円	15.7億円	16.5億円	74.3億円	14.9億円	14.1%
m) 元金償還金	28.0億円	27.9億円	27.9億円	130.2億円	26.0億円	24.7%
n) 利子償還金	12.0億円	10.7億円	11.1億円	60.2億円	12.0億円	11.4%
合 計	120.0億円	109.0億円	115.9億円	526.8億円	—	100.0%

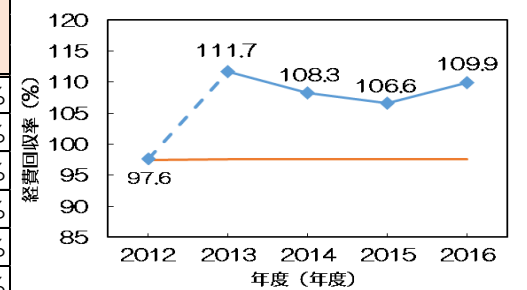


図36 経費回収率の推移

5ヶ年の評価 総まとめ

→ 施策ごとの総合評価（◎1、○5、△1）及び当初の見込みに近い
決算状況から、計画に沿った経営を行うことができたといえる。
