


計画の名称	地域における下水道の総合的な推進（防災・安全）		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度（4年間）	交付対象	町田市
計画の目標			

・下水道の整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）				
・重要な管きよのうち汚水幹線の地震対策実施率を51.8%から52.4%に増加させる。 ・避難所にマンホールトイレを整備し、整備率を22.0%に増加させる。 ・管きよの長寿命化対策を実施し、対策実施率を2.4%に増加させる。 ・成瀬クリーンセンター、鶴見川クリーンセンター及び鶴川ポンプ場における標準耐用年数を経過した設備について、100%改築する。				

定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値				備考				
				当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H28末)						
重要な管渠のうちの汚水幹線地震対策実施率				計画	51.8 %	52.1 %	52.4 %					
耐震化または減災対策が行われている汚水幹線延長(km)／汚水幹線総延長(106.48km)				実施	51.8 %	77.5 %	90.1 %					
避難所へのマンホール整備率				計画	0.0 %	14.0 %	22.0 %					
マンホール整備箇所/避難所(71箇所)				実施	0.0 %	14.0 %	22.0 %					
長寿命化対策実施率				計画	0.0 %	0.0 %	2.4 %					
長寿命化対策済みの処理分区／処理分区(41処理分区)				実施	0.0 %	0.0 %	0.0 %					
処理場の改築率				計画 実施	0 %	58 %	100 %					
改築設備完了箇所 / H28年度末までの改築設備完了予定箇所 (中分類箇所)					0 %	50 %	91 %					
全体事業費	計画 実績	合計 (A + B + C)	8,047 百万円 3,631 百万円	A	7,560 百万円 3,430 百万円	B	0 百万円 0 百万円		C	487 百万円 201 百万円	効果促進事業費の割合 C／(A + B + C)	6.1% 5.5%

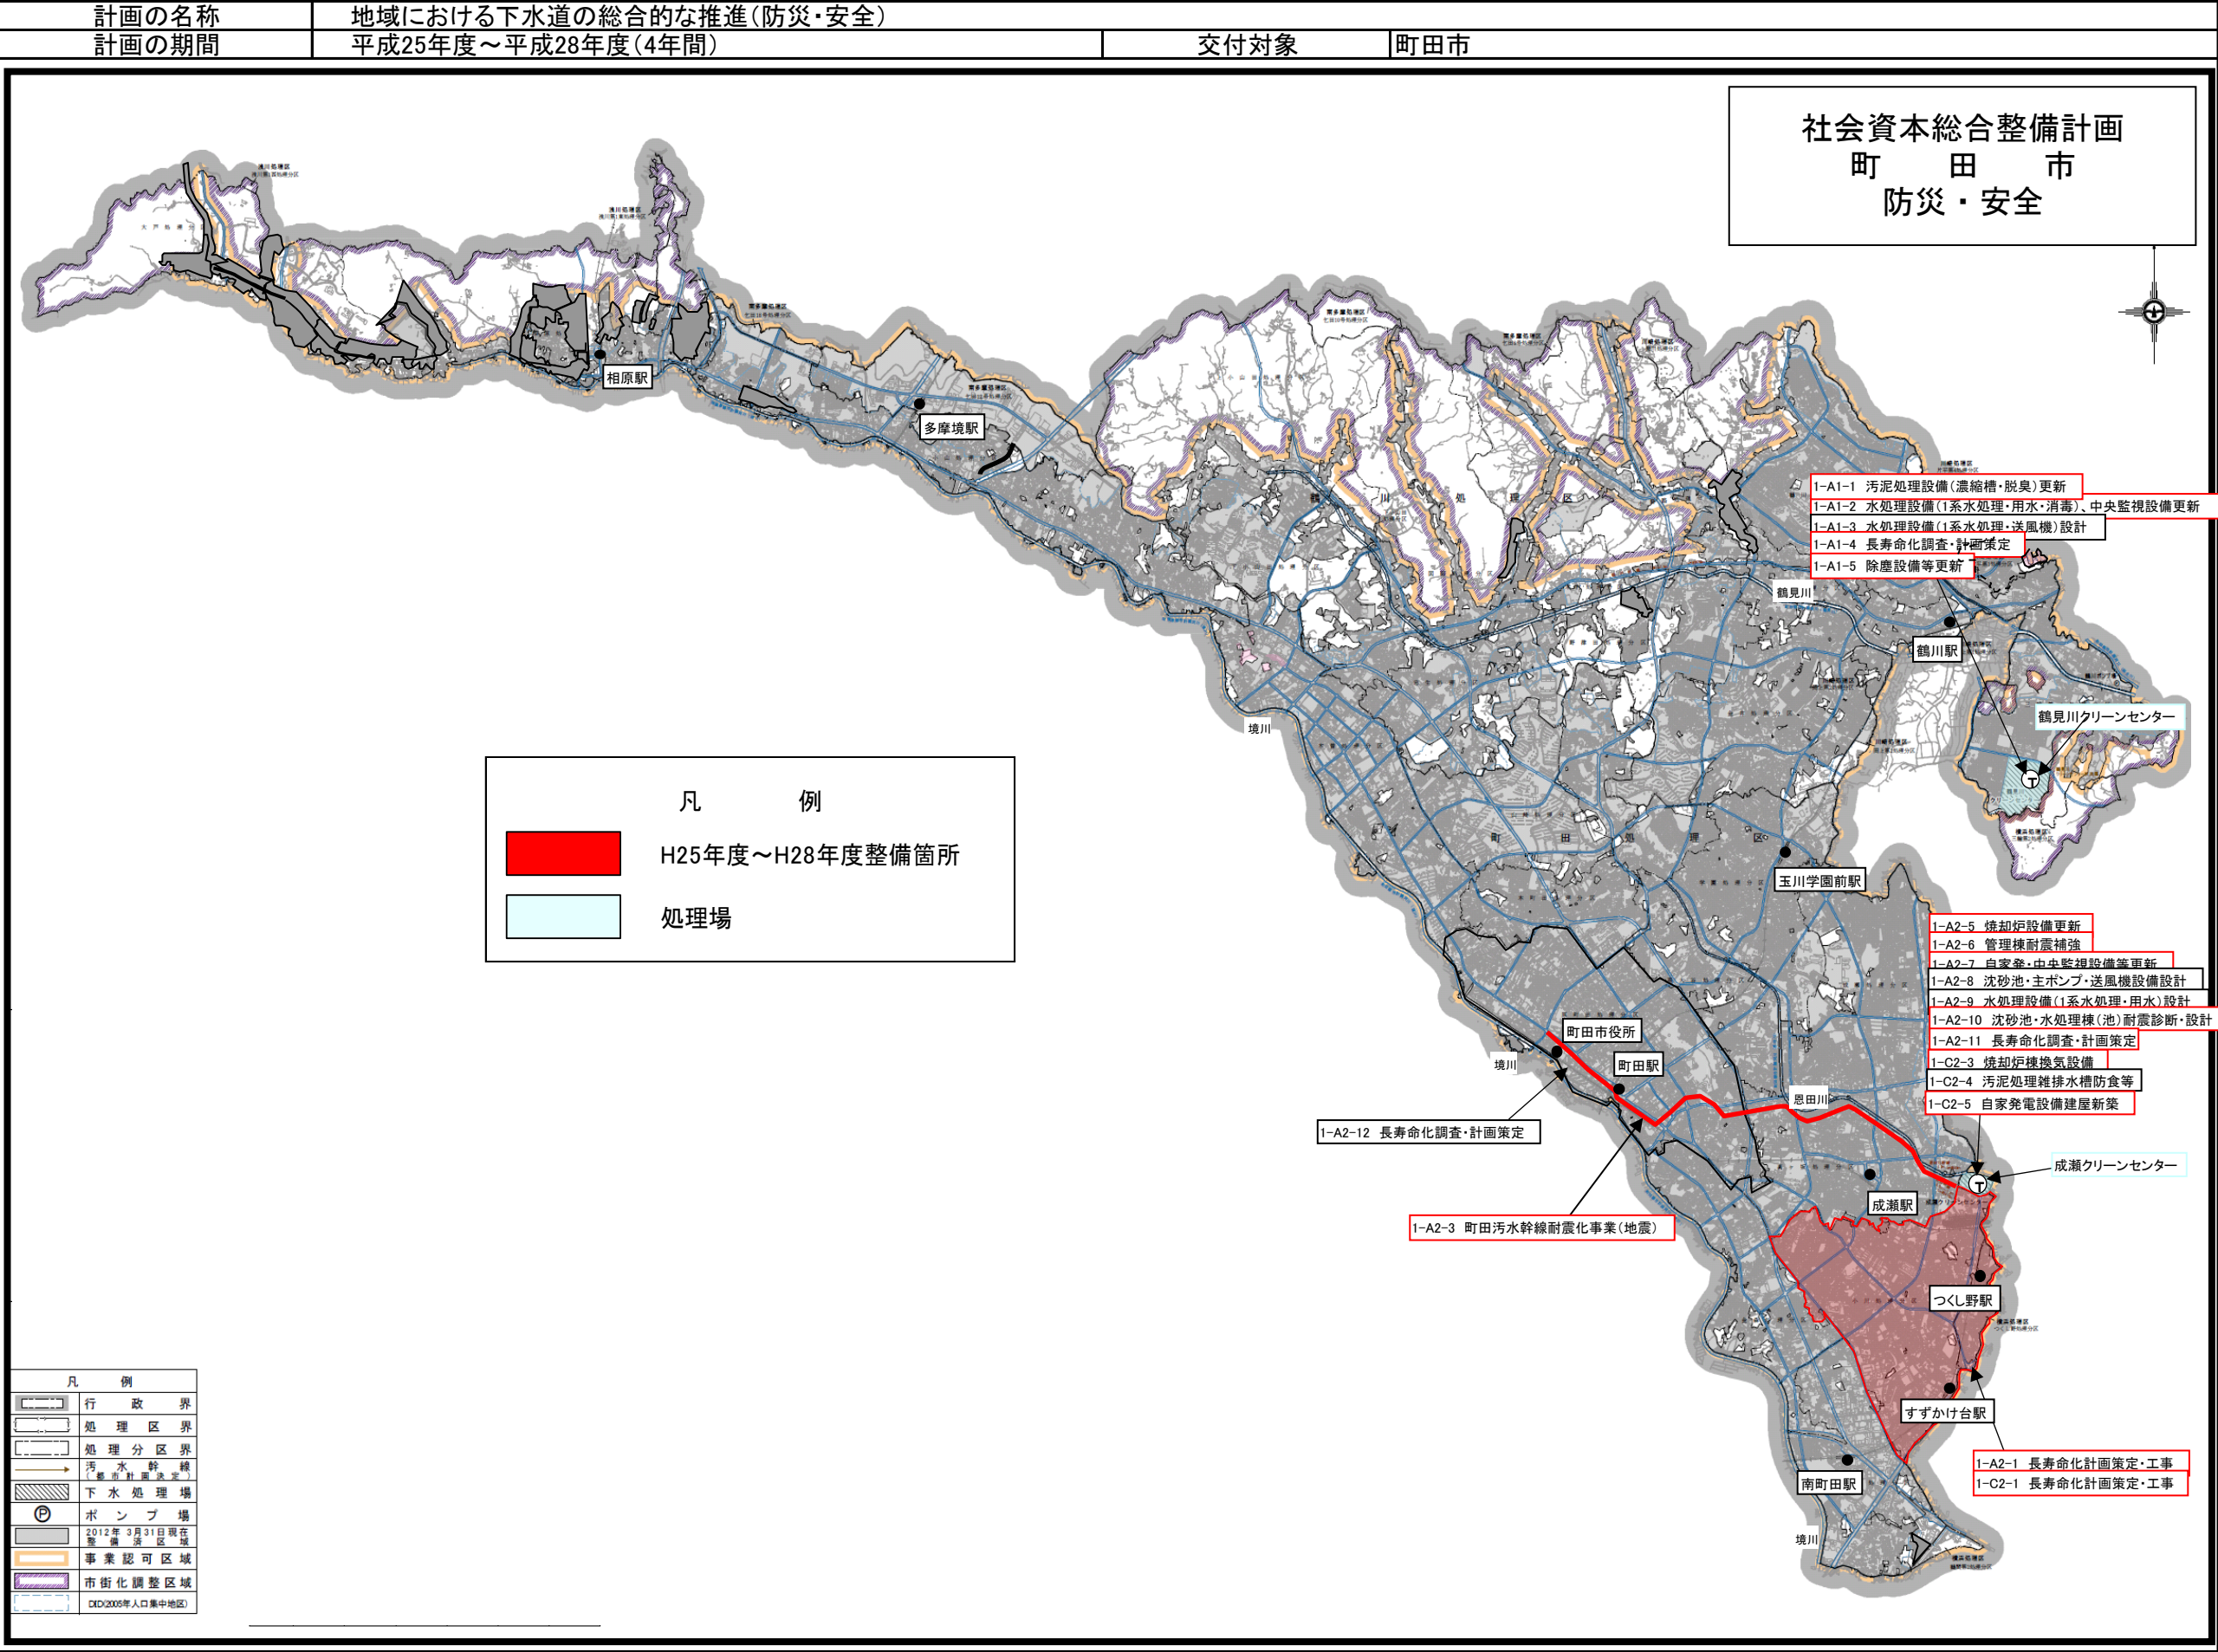

計画の名称	地域における下水道の総合的な推進(防災・安全)		
計画の期間	平成25年度～平成28年度(4年間)	交付対象	町田市

