

鶴川東地区の新たな学校に建設する仮設校舎について

鶴川東地区の新たな学校は、現在の鶴川第二小学校の既存校舎を解体し同校地内に新校舎を建設します。また、新校舎を建設する間、児童は同校地内に建設する仮設校舎で学校生活を送ることになります。

1 想定される仮設校舎の配置について


仮設校舎の配置については、第4回検討会においてその時点で想定される複数の案を別添1のとおり提示しましたが、児童の体育の授業や休み時間における運動スペースを広く確保してほしいとのご意見を踏まえ、現時点においてできる限りグラウンドを広く確保できる案を改めて検討しましたので、別添2のとおり報告します。

2 想定される工事スケジュールについて


別添2の下段「鶴川東地区統合校建替え工事の流れ」をご参照ください。

B案


① (既存プール解体・仮設校舎建設時)

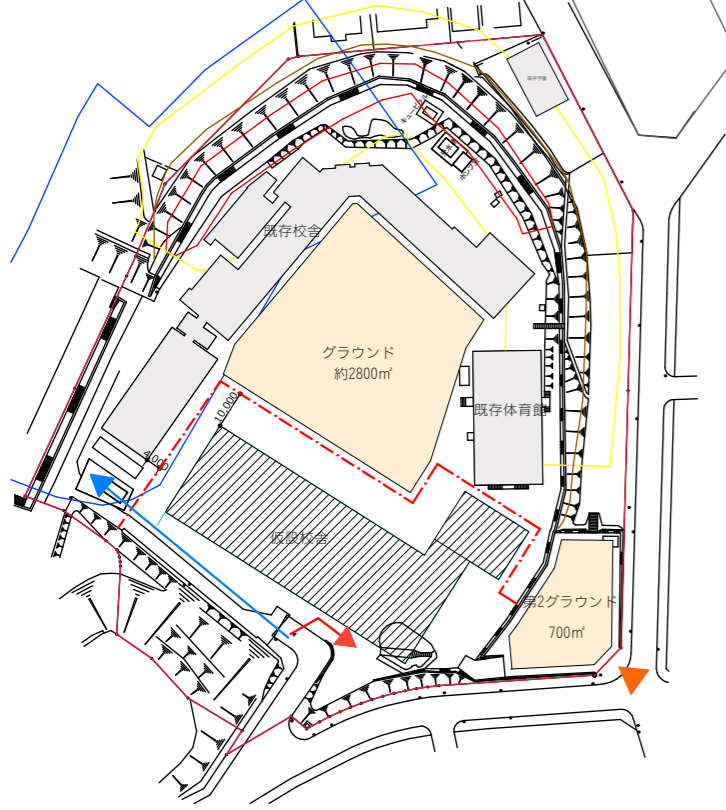


② (既存校舎解体時)

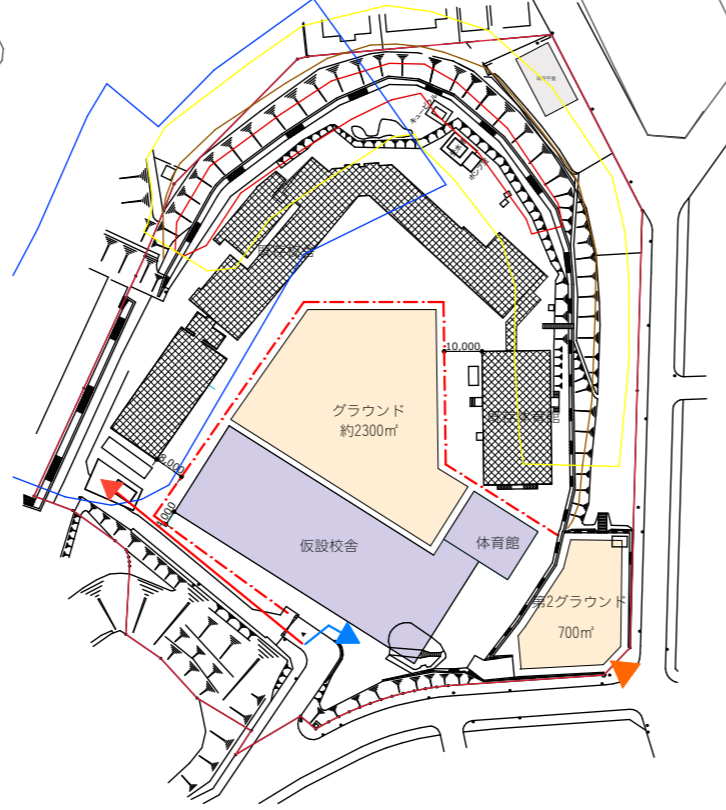

③ (新校舎建設時)

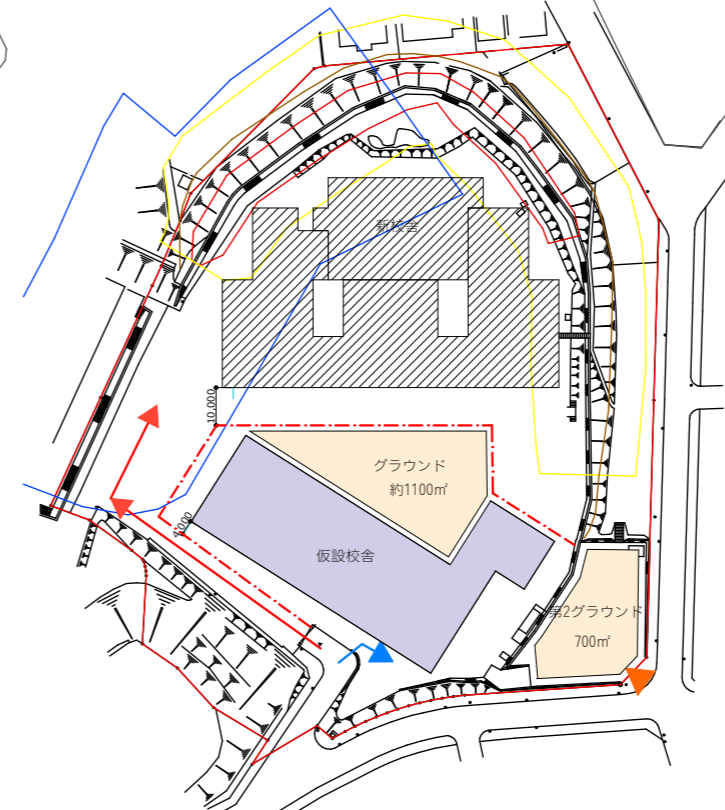


④ (仮設校舎解体時)

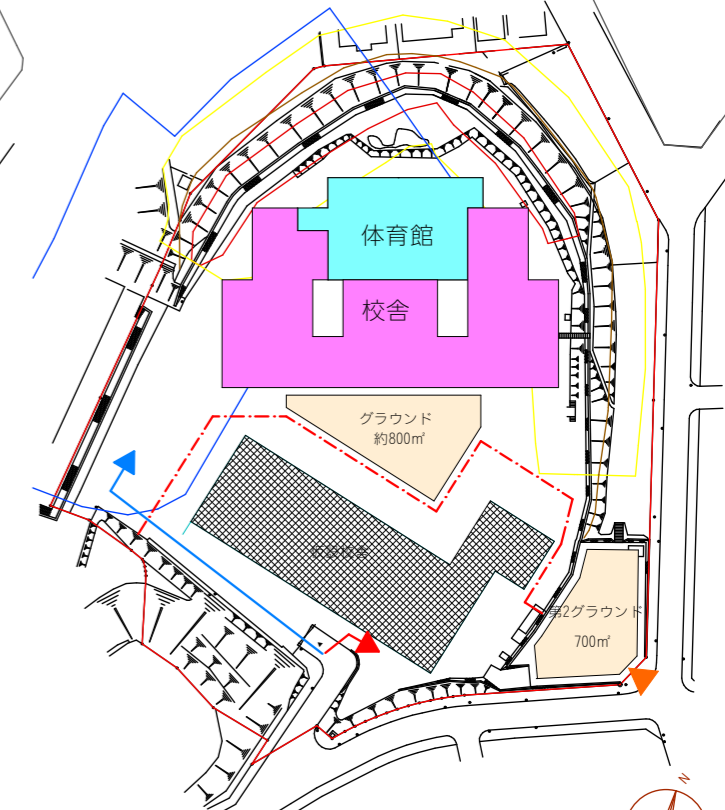


C案


① (既存プール解体・仮設校舎建設時)

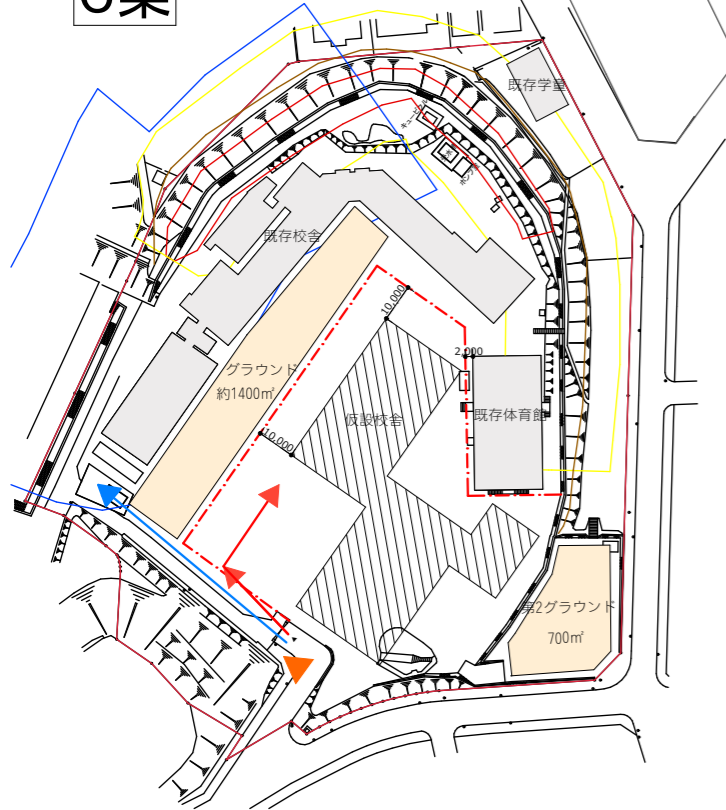


② (既存校舎解体時)

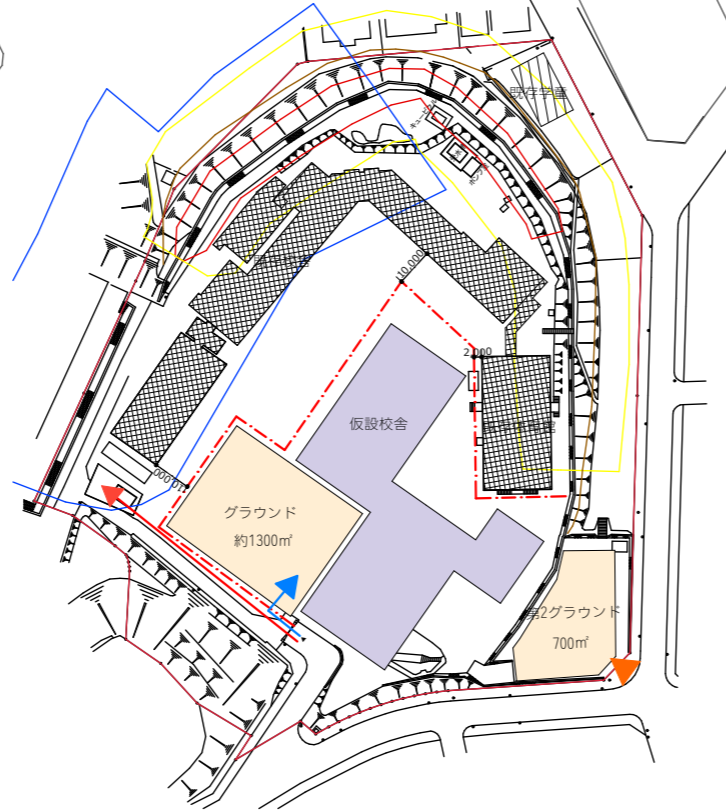

③ (新校舎建設時)

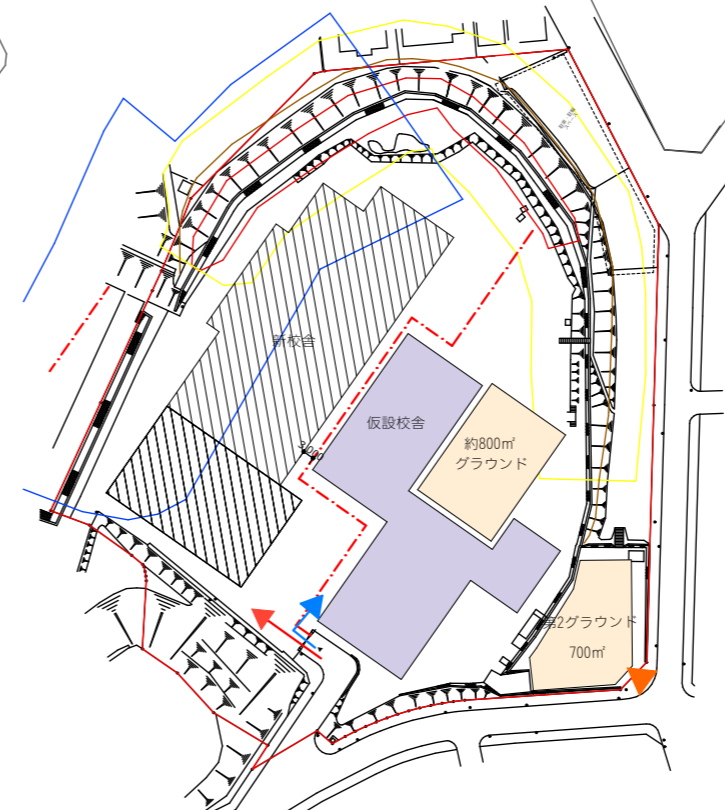

④ (仮設校舎解体時)

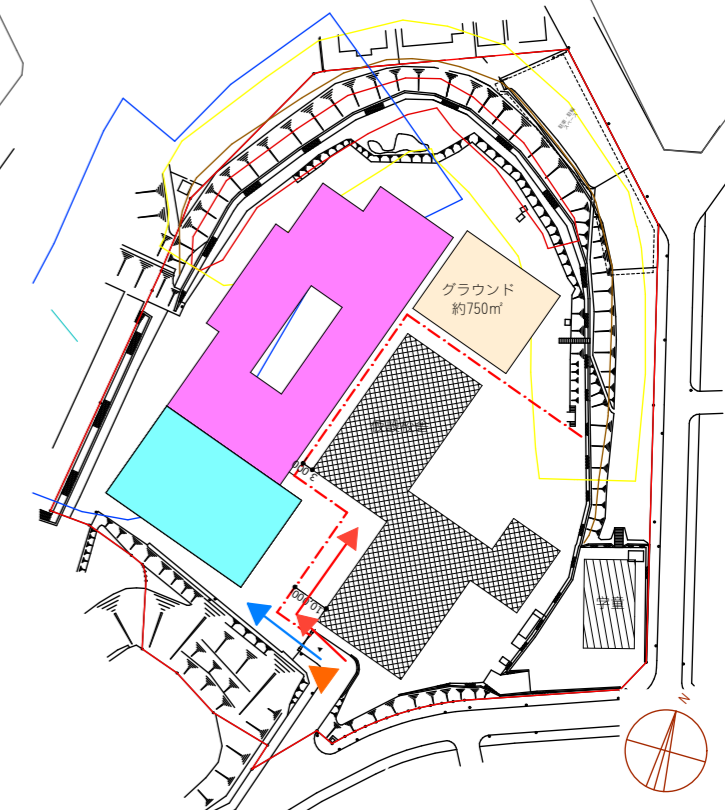


〈仮設校舎建設時の注意点〉
 ・校舎と工事建物が近接する場合、採光、通風確保の困難、騒音等が懸念される。
 ・工事車両動線と児童の通学動線が重ならないようにする。重なる場合は、ガードマンを配置する。
 ・工事建物が10m程度を資材置き場として活用する。


- ▲ 児童
- ← 工事車両動線
- ← 一般車両動線
- [斜線] 解体建物
- [点線] 新設建物
- [灰色] 既存校舎
- [紫色] 仮設校舎
- [ピンク] 新校舎
- [シアン] 新体育館
- [オレンジ] 工事時の仮グラウンド
- [赤点線] 工事時の仮囲い

※この工程表は2022年12月14日時点の想定であり、確定したものではありません。

①既存プール解体・仮設校舎建設時

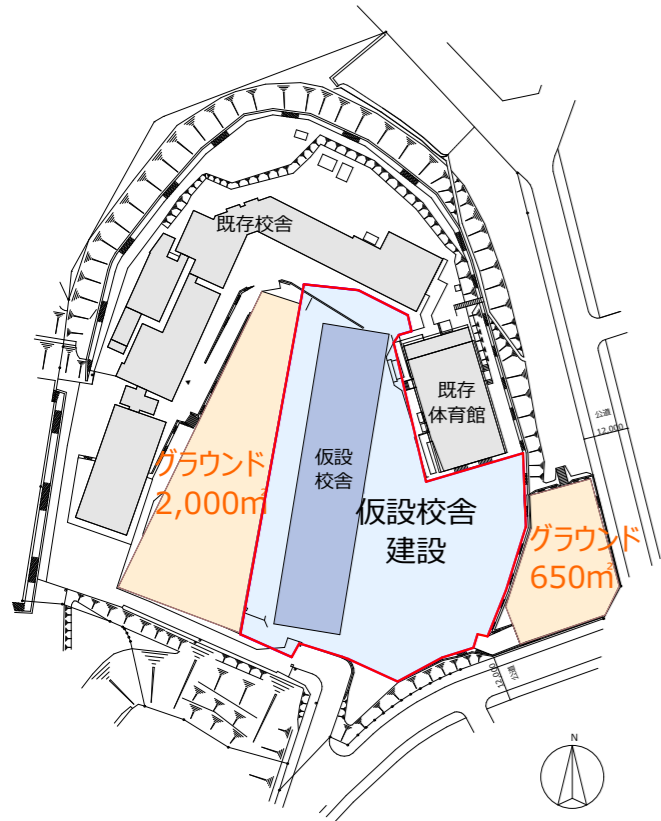

②既存校舎解体

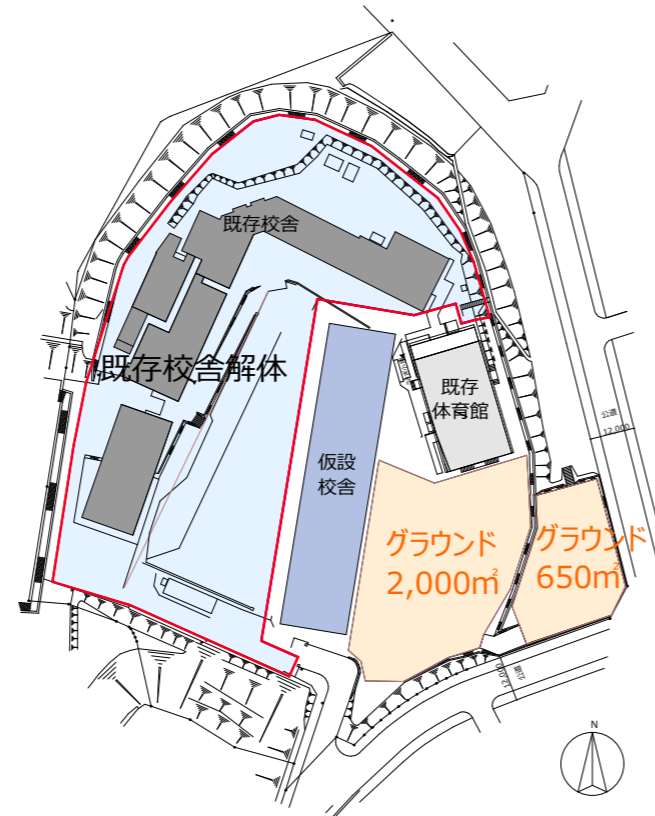

③新校舎建設



④仮設校舎解体中



- 解体建物
- 既存校舎
- 仮設校舎
- 新校舎
- 新体育館
- 工事時の仮グラウンド
- 工事時の仮囲い

【鶴川東地区統合校建替え工事の流れ】

年度	2021	2022	2023年度												2024年度												2025年度												2026年度												2027年度												2028年度												2029年度																				
月			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
基本計画	基本計画																																																																																														
新校舎設計			基本設計・実施設計																																																																																												
プール解体															解体 設計		プール解体工事																																																																														
仮校舎															仮校舎 調査・設計		申請		仮校舎 建設				仮校舎 賃貸借期間												解体																																																												
既存解体																											既存校舎 解体工事																																																																				
新校舎建設																											新校舎 建設工事																																																																				
校庭整地																																																			校庭整地																																												

↑
統合

↑
新校舎
使用開始
